



N E X O N D

NEW WAYS TO GO BEYOND

Reporting ESG Pilar III

Ponto de Situação #10



18 de março de 2024

Agenda

Objetivos

Realização da 10ª reunião de acompanhamento de projeto, de acordo com a seguinte ordem de atividades:

Sumário
Executivo

Visão global sobre evolução da execução do projeto, riscos e dependências principais

Planeamento

Resumo do *status* das atividades a realizar ao longo do projeto

Esclarecimentos

Definição / discussão de temas identificados

Próximos Passos

Identificação das próximas atividades a desenvolver

Data

18 de março de 2024

Hora Início - Fim

9:30 – 10:30

Participantes



Susana Bernardo



Luis Godinho

Hugo Reia

Ana Rita Caguerelho

Helder Fernandes

Local

Microsoft Teams Call



Progresso ●

- Conclusão da documentação do processo.



Riscos ●




Próximos Passos

RAG STATUS

● Sem impactos ● Risco de impacto ● Impactos verificados

Planeamento (1|2)

Plano de projeto

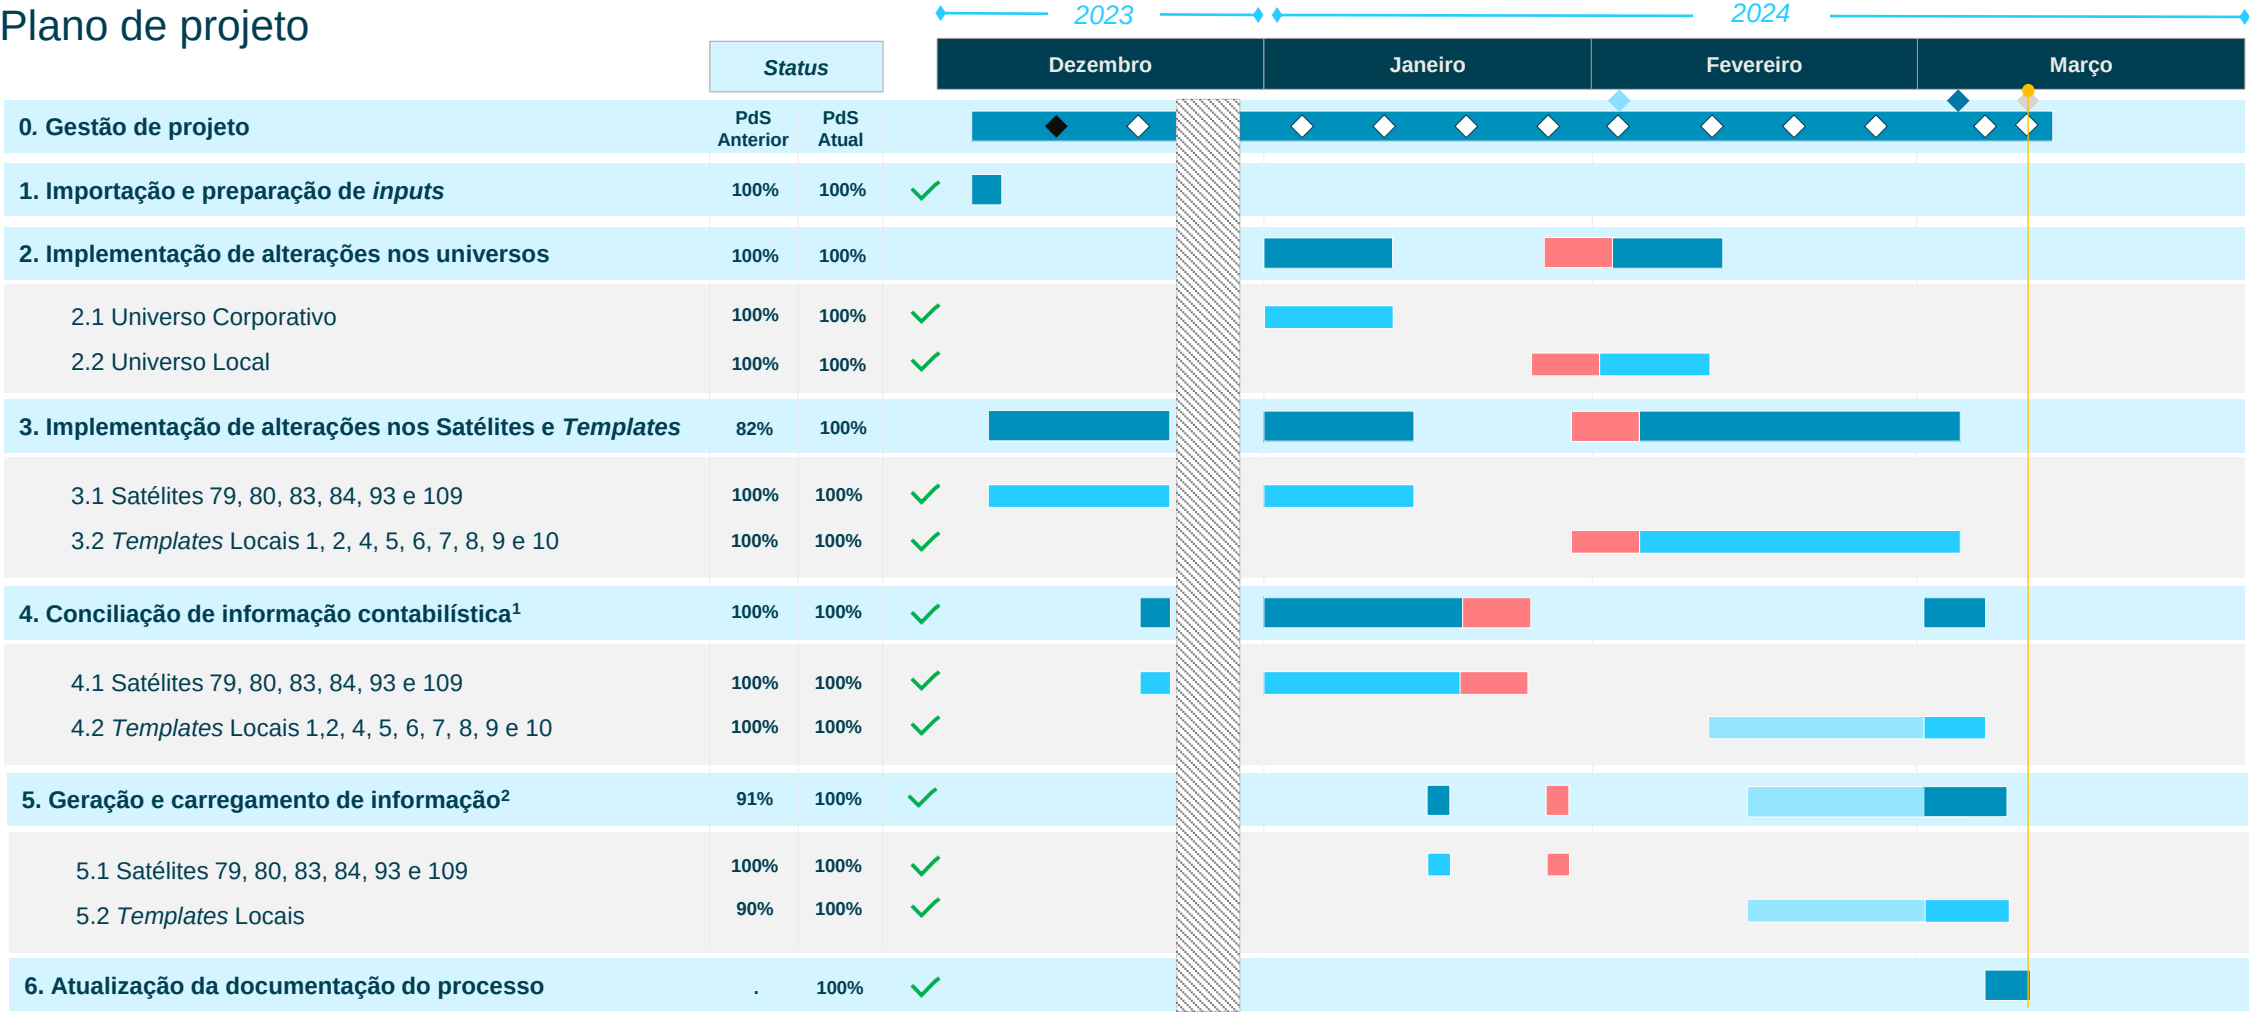

Legenda:

- ◆ Reunião de *Kick-off*
- ◇ Reunião de PDS
- ◆ 9 Fevereiro – Início de disponibilização dos templates
- ◆ 8 Março – Última data da disponibiliza dos templates
- ◆ 15 Março – Data da entrega dos templates ao regulador
- Freeze do projeto
- Atraso
- Antecipação de tarefa

Notas: O projeto prevê um período de *freeze* de 22 de dezembro a 29 de dezembro de 2023.
¹ Atividades não executadas em virtude de procedimentos de conciliação corporativa face ao paralelo enviado pela Contabilidade.
² Detalhe apresentado no *slide* 5.

- Sem atraso
- Atraso recuperável
- Atraso não recuperável
- Não aplicável

Planeamento (2|2)

Templates Locais

Seguem os *deadlines* para cada um dos *templates* locais:

<i>Templates</i>	Dependências	Data final prevista <i>input</i>	Data de entrega
<i>Templates 1,2 (STE)</i>	-	-	14 de Março ✓
<i>Template 1,4</i>	-	-	22 de Fevereiro ✓
<i>Template 2</i>	-	-	9 de Fevereiro ✓
<i>Templates 5</i>	-	-	16 de Fevereiro ✓
<i>Templates 6,7</i>	-	-	7 de Março ✓
<i>Template 8</i>	-	-	8 de Março ✓
<i>Template 10</i>	-	-	16 de Fevereiro ✓

Riscos e desafios

Riscos e *Issues*

Seguem os principais *riscos e issues* identificados no decorrer das atividades realizadas:

Descrição	Tipo de impacto	Impacto	Nível de impacto	Medida de mitigação	Estado / Conclusão	Data Abertura	Data Fecho
Ajustes contabilísticos a incidir sobre os <i>templates</i> STE	Plano/Tarefas	Atraso na reconciliação Mis-Contab por parte de CdG (6 de Março)	Alto	Envio de versão preliminar sem ajustes	Fechado	28 de fevereiro	14 de março

¹ Atividade com *ownership* Banco Santander.



NE Y ON D

NEW WAYS TO GO BEYOND

WWW.NEYOND.PT
