



N E Y O N D

NEW WAYS TO GO BEYOND

Reporting ESG Pilar III

Ponto de Situação #3



5 de janeiro de 2024

Agenda

Objetivos

Realização da 3ª reunião de acompanhamento de projeto, de acordo com a seguinte ordem de atividades:

Sumário Executivo	Visão global sobre evolução da execução do projeto, riscos e dependências principais
Planeamento	Resumo do <i>status</i> das atividades a realizar ao longo do projeto
Esclarecimentos	Definição / discussão de temas identificados
Próximos Passos	Identificação das próximas atividades a desenvolver

Data

5 de janeiro de 2024

Hora Início - Fim

10:00 – 11:00

Participantes



Susana Bernardo



Hugo Reia

Ana Rita Caguerelho

Dora Roxo

Local

Microsoft Teams Call



Progresso ●

- Continuação da recolha de dados necessários para o exercício de Dez23;
- Continuação da implementação de alterações metodológicas e funcionais nos processos de geração de Satélites;
- Continuação dos desenvolvimentos de geração do Satélite 109;
- Geração de informação de envio para a Gloval (imóveis do MUG);
- Início da geração do universo Corporativo.



Riscos e desafios ●

- Receção de adjudicados;
- Metodologia de conciliação (ajustes contabilísticos);
- Mapeamento de características associadas a *motor vehicle loans*;
- Receção de novas *guidelines* a 21 de dezembro de 2023;
- Metodologia de cálculo de emissões para *motor vehicle loans* (score 2 e 3);
- Envio de informação para a Gloval.



Dependências ●


- Corporação;
- Contabilidade;
- Controlo de Gestão;
- Desinvestimentos.

RAG STATUS

● Sem impactos ● Risco de impacto ● Impactos verificados

Planeamento

Plano de projeto

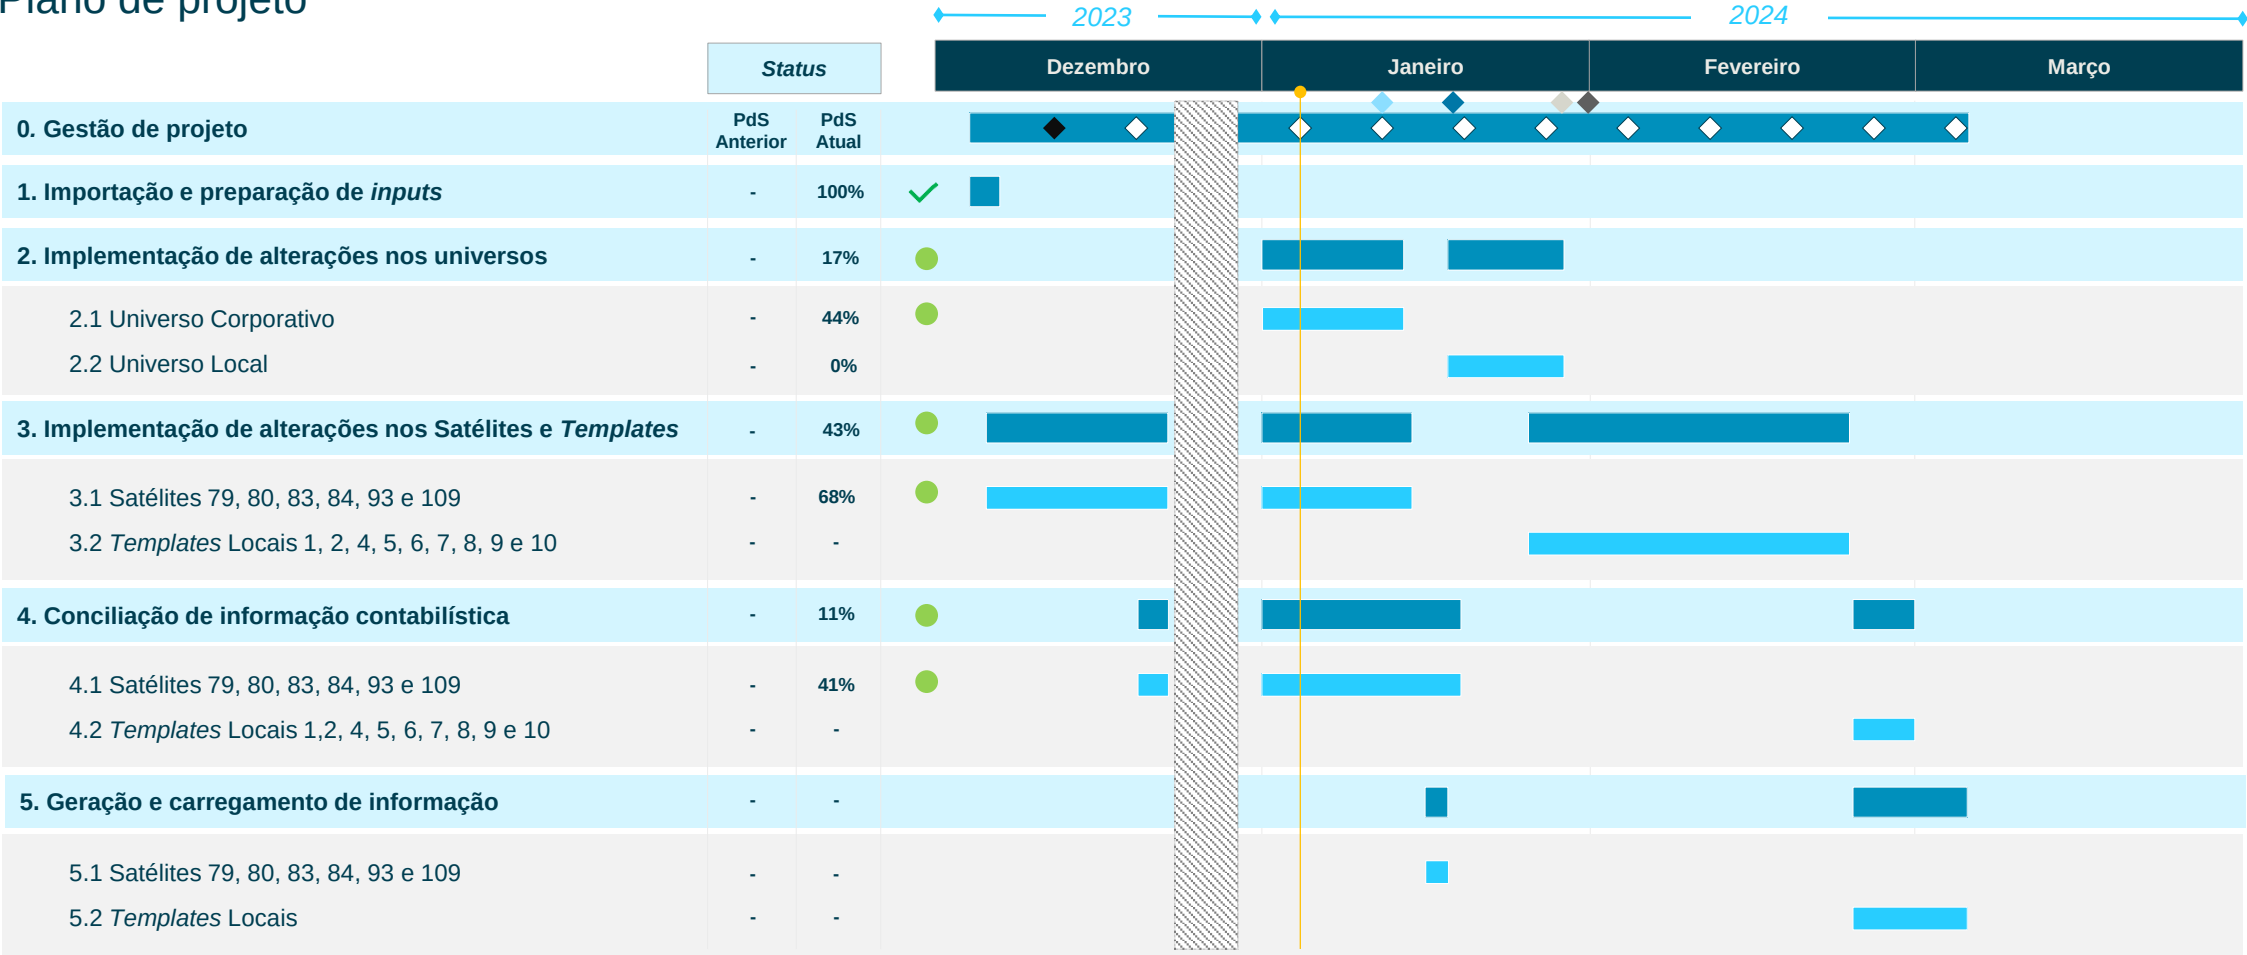

- Legenda:**
 - ◆ Reunião de Kick-off
 - ◇ Reunião de PDS
 - ▨ Freeze do projeto
- ◆ 12 Janeiro – Data de abertura do front
 - ◆ 18 Janeiro – Data até à qual deverá ser submetida a primeira versão de cada Satélite
 - ◆ 26 Janeiro – Data para receber informação extra contabilística
 - ◆ 31 Janeiro – Data até à qual deverá ser submetida a última versão de cada Satélite
- Sem atraso
 - Atraso recuperável
 - Atraso não recuperável

Notas: O projeto prevê um período de freeze de 22 de dezembro a 29 de dezembro de 2023.

Riscos e desafios

Riscos e *Issues*

Seguem os principais **riscos e issues** identificados no decorrer das atividades realizadas:

Descrição	Tipo de impacto	Impacto	Nível de impacto	Medida de mitigação	Estado / Conclusão	Data Abertura	Data Fecho
Adjudicados	Plano/Tarefas	A não receção dos ficheiros de adjudicados poderá impactar o envio de informação para a Gloval.	Alto	-	Aberto ¹	-	05 de janeiro
Metodologia de conciliação (ajustes contabilísticos)	Tarefas	Impacto nos <i>timings</i> de reporte.	Médio	-.	Aberto ¹	19 de dezembro	-
Mapeamento de características associadas a <i>motor vehicle loans</i>	Tarefas	Dificuldade de mapeamento de métricas associadas aos Satélites 83, 84 e 93.	Médio	A definir mapeamento com base no <i>email</i> da área de contratação.	Aberto ¹	20 de dezembro	-
Receção de novas <i>guidelines</i> a 21 de dezembro de 2023	Plano/Tarefas	Impacto nos <i>timings</i> de implementação.	Alto	-	Aberto ¹	21 de dezembro	-
Metodologia de cálculo de emissões para <i>motor vehicle loans</i> (score 2 e 3)	Tarefas	Impacto no valor de emissões pela não utilização do <i>score</i> 2 e 3.	Médio	Cálculo de emissões através dos <i>score</i> 4 e 5.	Aberto ¹	05 de janeiro	-

¹ Atividade com *ownership* Banco Santander.

Próximos Passos

Listagem de próximos passos

Apresentamos em seguida as próximas atividades a desenvolver até 15 de janeiro e respetivos responsáveis:

ID	Âmbito	Atividades – 5 de janeiro a 15 de janeiro	Responsável	Data Fecho
1	Geração do universo corporativo	Processamento da informação de envio para a Gloval.		5 de janeiro
2		Processamento de métricas de contratos + clientes		8 de janeiro
3		Processamento de métricas de colaterais		9 de janeiro
4		Processamento da informação de certificados energéticos		11 de janeiro
5	Geração dos satélites	Processamento de alteração metodológicas e geração de informação		15 de janeiro
6		Conciliação de informação contabilística		15 de janeiro



NE Y ON D

NEW WAYS TO GO BEYOND

WWW.NEYOND.PT
