



N E X O N D

NEW WAYS TO GO BEYOND

Reporting ESG Pilar III

Ponto de Situação #4



12 de janeiro de 2024



Agenda

Objetivos

Realização da 4ª reunião de acompanhamento de projeto, de acordo com a seguinte ordem de atividades:

Sumário
Executivo

Visão global sobre evolução da execução do projeto, riscos e dependências principais

Planeamento

Resumo do *status* das atividades a realizar ao longo do projeto

Esclarecimentos

Definição / discussão de temas identificados

Próximos Passos

Identificação das próximas atividades a desenvolver

Data

12 de janeiro de 2024

Hora Início - Fim

10:00 – 11:00

Participantes



Susana Bernardo



Hugo Reia

Ana Rita Caguerelho

Dora Roxo

Helder Fernandes

Local

Microsoft Teams Call



Progresso ●

- Continuação da recolha de dados necessários para o exercício de Dez23;
- Continuação da implementação de alterações metodológicas e funcionais nos processos de geração de Satélites;
- Envio de informação para a Gloval (imóveis do MUG + adjudicados);
- Finalização da geração do universo corporativo;
- Início da geração dos satélites corporativos;
- Início de análises comparativas face aos exercícios de Jun23 e Piloto;
- Início de processo de validação (ex. controlos vs GD).



Issues ●

- Problemas na geração da tabela FR012;
- Problemas nas operações presentes na tabela de operações verdes;
- Problemas nos *inputs* corporativos para o GAR.

Riscos ●

- Risco na marcação da atividade associada a hipotecas com ano de construção > 2020;
- Entrega de informação pela Gloval.



Próximos Passos


- Processamento de alteração metodológicas e geração de informação;
- Conciliação de informação contabilística;
- Geração e carregamento de informação.

RAG STATUS

● Sem impactos ● Risco de impacto ● Impactos verificados

Planeamento (1|2)

Plano de projeto

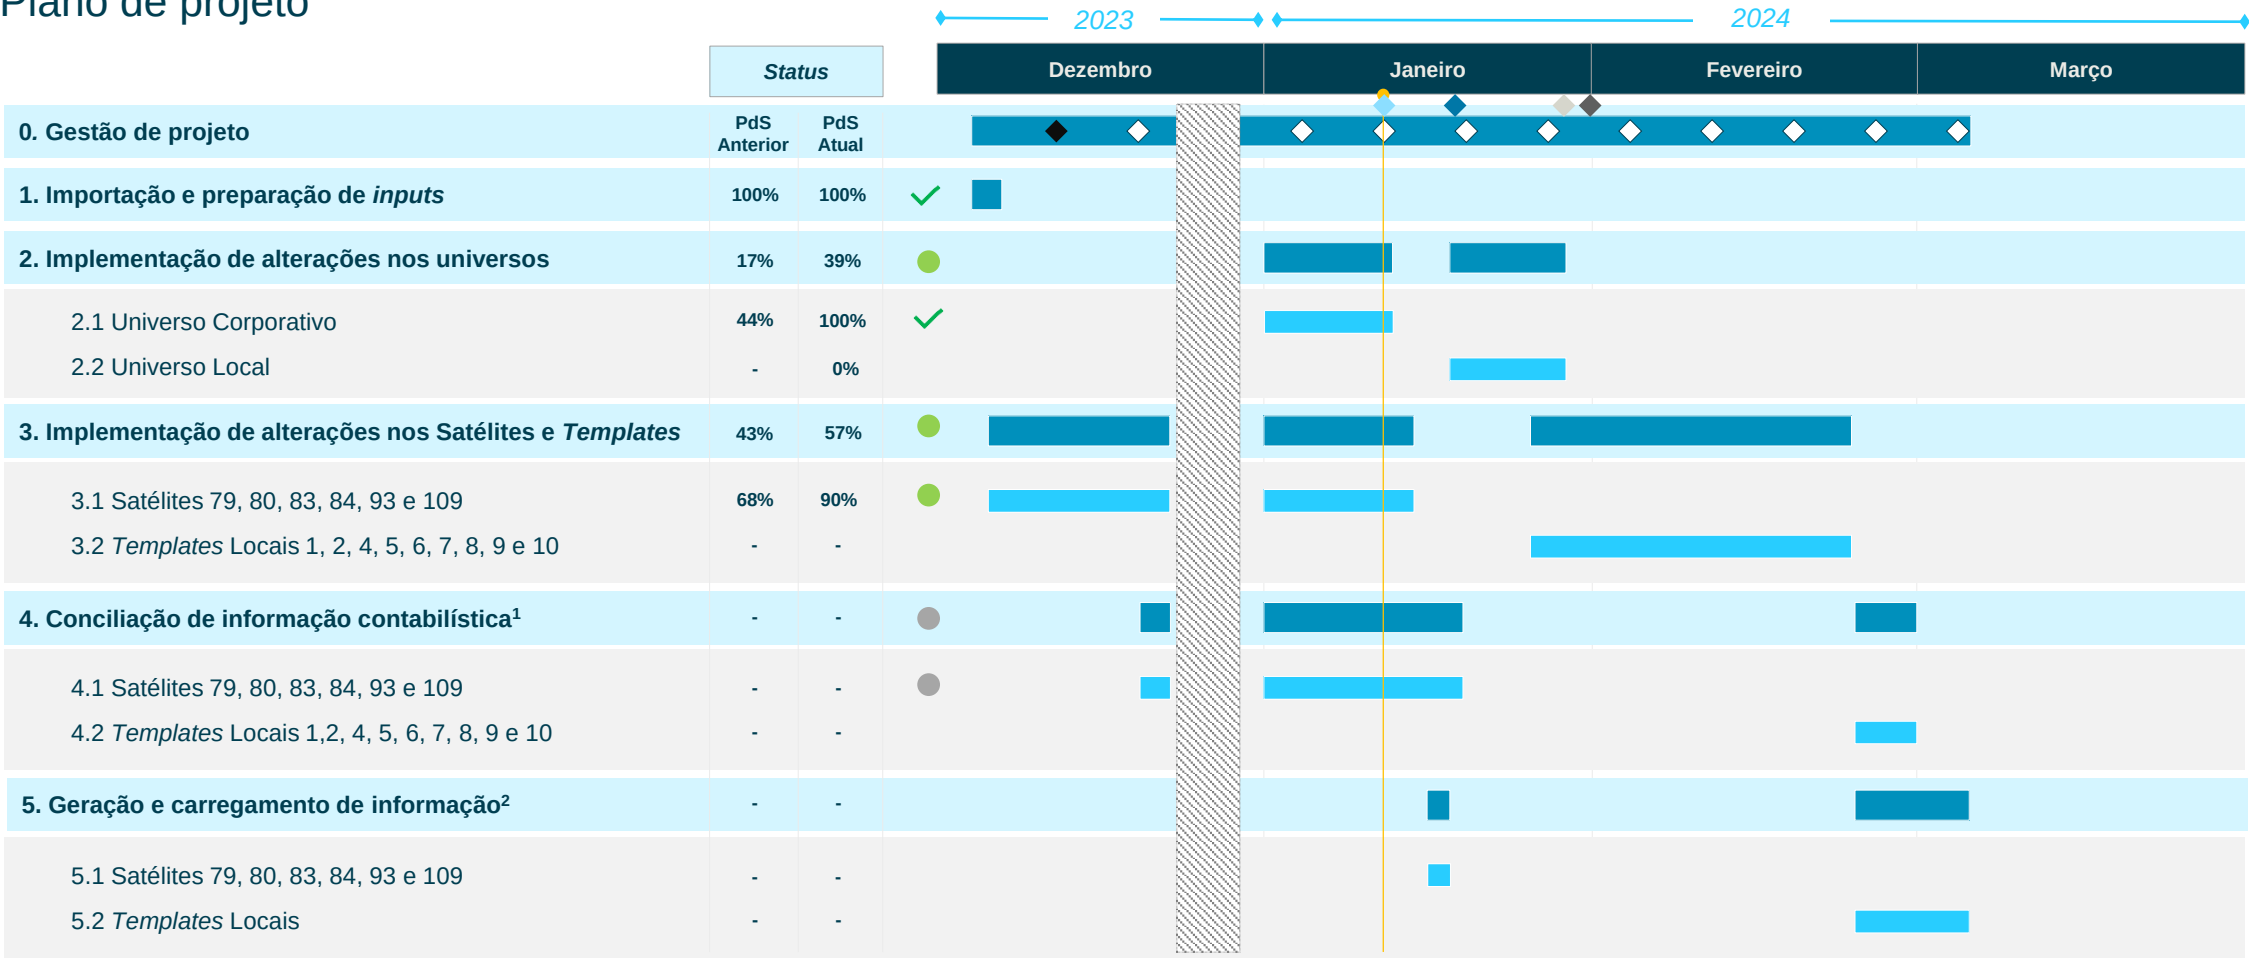

- Legenda:**
 - ◆ Reunião de *Kick-off*
 - ◇ Reunião de PDS
 - Freeze do projeto
 - 12 Janeiro – Data de abertura do *front*
 - 18 Janeiro – Data até à qual deverá ser submetida a primeira versão de cada Satélite
 - 26 Janeiro – Data para receber informação extra contabilística
 - 31 Janeiro – Data até à qual deverá ser submetida a última versão de cada Satélite
 - Sem atraso
 - Atraso recuperável
 - Atraso não recuperável
 - Não aplicável

Notas: O projeto prevê um período de *freeze* de 22 de dezembro a 29 de dezembro de 2023.
¹ Atividades não executadas em virtude de procedimentos de conciliação corporativa face ao paralelo enviado pela Contabilidade.
² Detalhe apresentado no *slide* 5.

Planeamento (2|2)

Satélites Corporativos

Seguem os *deadlines* para cada um dos satélites corporativos:

Satélites	Dependências	Data final prevista <i>input</i>	Data de entrega ¹	Prioridade Corporação
Satélite 79	-	-	15 de Janeiro	2
Satélite 80	-	-	17 de Janeiro	1
Satélite 83	Receção de informação de operações <i>Green</i> .	12 de Janeiro	17 de Janeiro	4
Satélite 84	Receção de informação de operações <i>Green</i> .	12 de Janeiro	17 de Janeiro	3
Satélite 93	Receção de informação de operações <i>Green</i> .	12 de Janeiro	18 de Janeiro	5
Satélite 109	-	-	15 de Janeiro	6

¹Todas as datas de entrega presentes têm como pressuposto que a data final de entrega dos *inputs* são as indicadas. O reprocessamento dos satélites devido a alteração de *inputs* (novo ficheiro da Corporação e totalidade de imóveis Gloval) carecerá de replaneamento e disponibilização de novas datas.

Riscos e desafios

Riscos e *Issues*

Seguem os principais **riscos e issues** identificados no decorrer das atividades realizadas:

Descrição	Tipo de impacto	Impacto	Nível de impacto	Medida de mitigação	Estado / Conclusão	Data Abertura	Data Fecho
Problemas na geração da tabela FR012	Plano/Tarefas	Atraso na geração do universo corporativo.	Médio	-	Fechado	09 de janeiro	10 de janeiro
Problemas nas operações presentes na tabela de operações verdes	Tarefas	Atraso na geração dos satélites corporativos (83 e 84).	Médio	-.	Aberto ¹	11 de janeiro	-
Problemas nos inputs corporativos para o GAR	Tarefas	Atraso na geração do satélite 84.	Médio	Uso do <i>input</i> recebido em Junho23	Aberto ¹	11 de dezembro	-
Risco na marcação da atividade associada a hipotecas com ano de construção > 2020	Plano/Tarefas	Impacto nos <i>timings</i> de implementação.	Médio	Definição de metodologia alternativa	Aberto ¹	05 de janeiro	-

¹ Atividade com *ownership* Banco Santander.

Próximos Passos

Listagem de próximos passos

Apresentamos em seguida as próximas atividades a desenvolver até 18 de janeiro e respectivos responsáveis:

ID	Âmbito	Atividades – 12 de janeiro a 18 de janeiro	Responsável	Data Fecho
1	Geração dos satélites	Processamento de alteração metodológicas e geração de informação		15 de janeiro
2		Conciliação de informação contabilística		15 de janeiro
3		Geração e carregamento de informação		18 de janeiro



NE Y ON D

NEW WAYS TO GO BEYOND

WWW.NEYOND.PT
