



N E X O N D

NEW WAYS TO GO BEYOND

Reporting ESG Pilar III

Ponto de Situação #5



5 de fevereiro de 2024

Agenda

Objetivos

Realização da 4ª reunião de acompanhamento de projeto, de acordo com a seguinte ordem de atividades:

Sumário Executivo	Visão global sobre evolução da execução do projeto, riscos e dependências principais
Planeamento	Resumo do <i>status</i> das atividades a realizar ao longo do projeto
Esclarecimentos	Definição / discussão de temas identificados
Próximos Passos	Identificação das próximas atividades a desenvolver

Data

5 de fevereiro de 2024

Hora Início - Fim

16:30 – 17:00

Participantes



Susana Bernardo



Hugo Reia

Ana Rita Caguerelho

Dora Roxo

Helder Fernandes

Rita Matias

Local

Microsoft Teams Call



Progresso ●

- Conclusão do exercício corporativo;
- Continuação da implementação de alterações metodológicas e funcionais nos processos de geração de *templates*;
- Continuação da geração do universo local;
- Início de análises comparativas face aos exercícios de Jun23;
- Início de processo de validação (ex. controlos vs GD).



Riscos ●

- Possível impacto na geração dos *templates* provocados por todos os *issues* e riscos identificados ao longo do exercício corporativo.



Próximos Passos


- Processamento de alteração metodológicas e geração de informação;
- Conciliação de informação contabilística;
- Geração e carregamento de informação.

RAG STATUS

● Sem impactos ● Risco de impacto ● Impactos verificados

Planeamento (1|2)

Plano de projeto

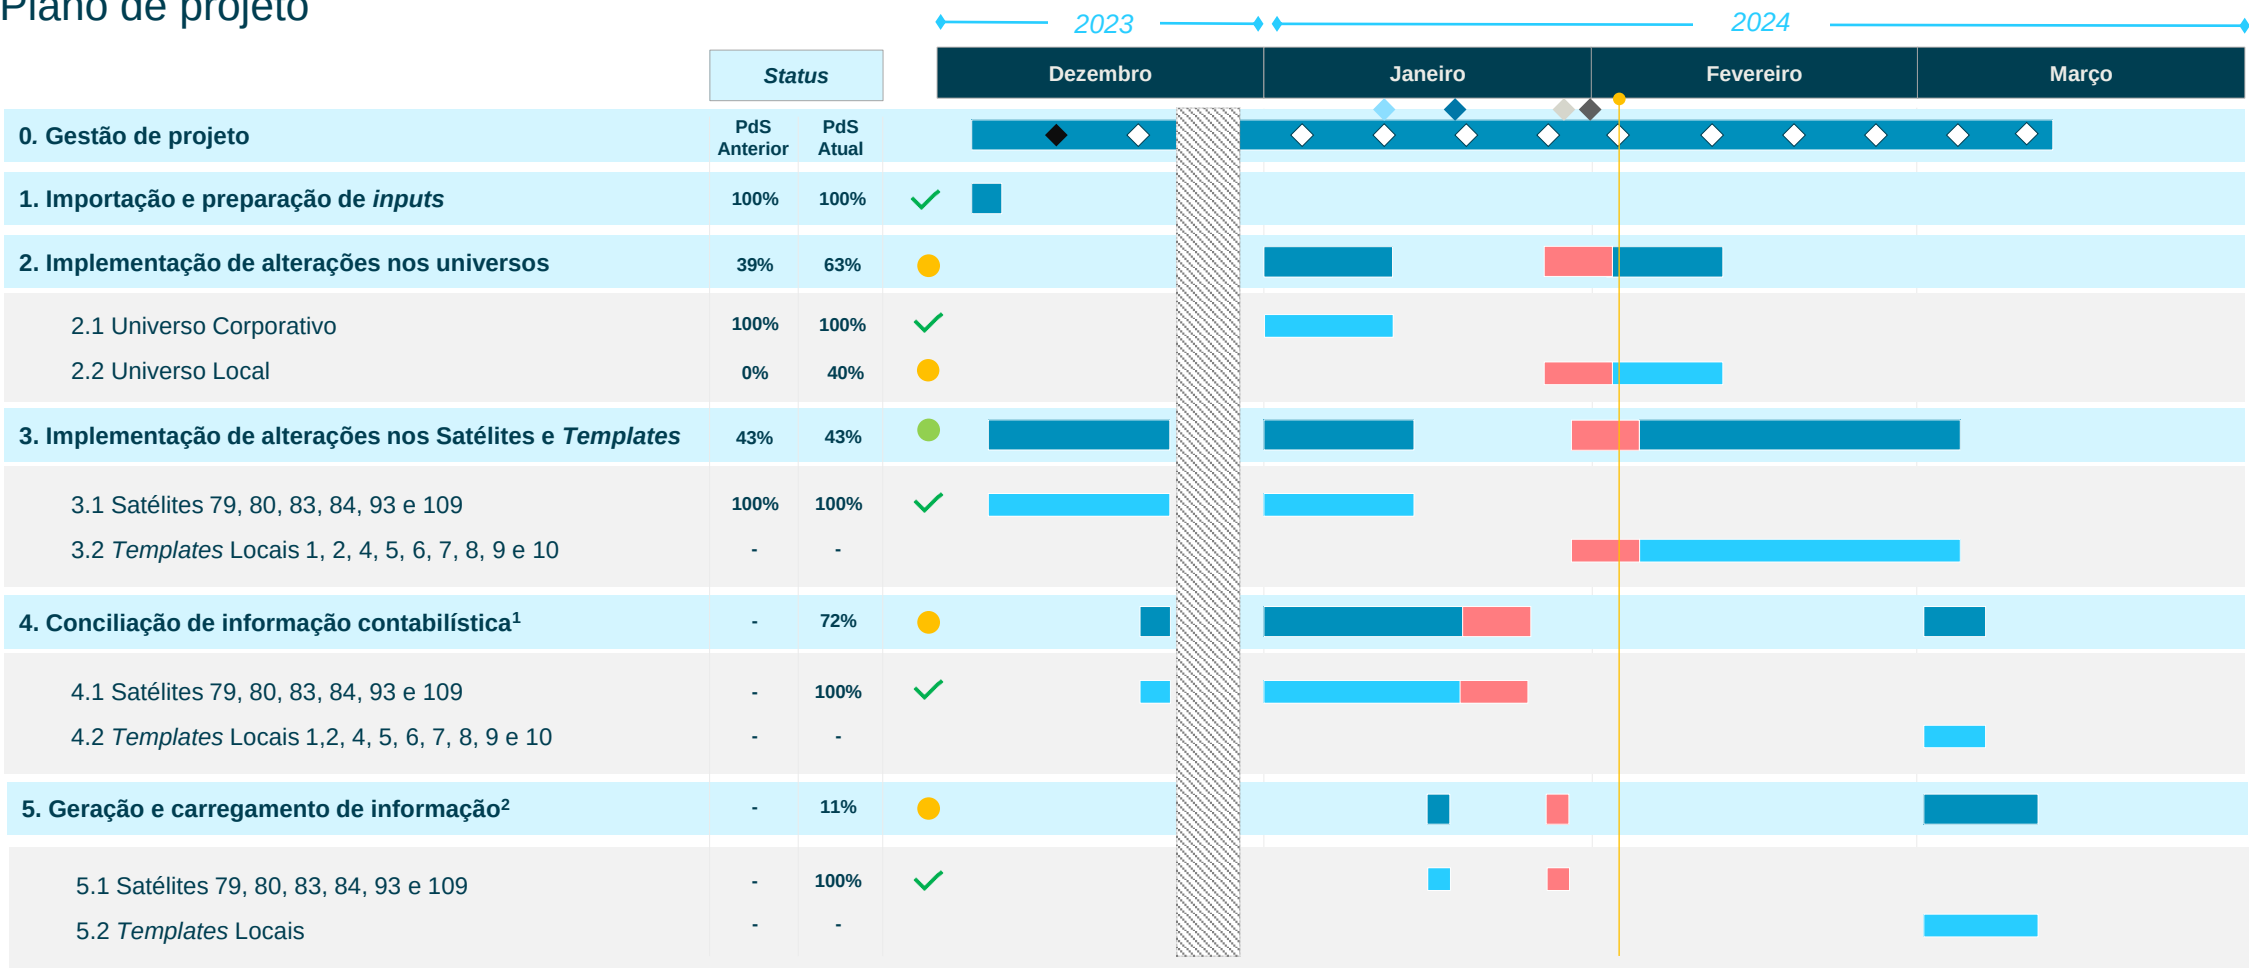

- Legenda:**
- ◆ Reunião de *Kick-off*
 - ◇ Reunião de PDS
 - ▨ *Freeze* do projeto
 - Atraso
 - ◆ 12 Janeiro – Data de abertura do *front*
 - ◆ 18 Janeiro – Data até à qual deverá ser submetida a primeira versão de cada Satélite
 - ◆ 26 Janeiro – Data para receber informação extra contabilística
 - ◆ 31 Janeiro – Data até à qual deverá ser submetida a última versão de cada Satélite
 - Sem atraso
 - Atraso recuperável
 - Atraso não recuperável
 - Não aplicável

Notas: O projeto prevê um período de *freeze* de 22 de dezembro a 29 de dezembro de 2023.
¹ Atividades não executadas em virtude de procedimentos de conciliação corporativa face ao paralelo enviado pela Contabilidade.
² Detalhe apresentado no *slide* 5.

Planeamento (2|2)

Templates Locais

Seguem os *deadlines* para cada um dos *templates* locais:

<i>Templates</i>	Dependências	Data final prevista <i>input</i>	Data de entrega
<i>Template 1,2 (STE)</i>	-	-	3 de Março
<i>Template 1</i>	-	-	5 de Março
<i>Template 2</i>	-	-	5 de Março
<i>Templates 4,5</i>	-	-	6 de Março
<i>Templates 6,7</i>	-	-	7 de Março
<i>Templates 8,9</i>	-	-	8 de Março
<i>Template 10</i>	-	-	6 de Março

Riscos e desafios

Riscos e *Issues*

Seguem os principais **riscos e issues** identificados no decorrer das atividades realizadas:

Descrição	Tipo de impacto	Impacto	Nível de impacto	Medida de mitigação	Estado / Conclusão	Data Abertura	Data Fecho
Problemas na geração da tabela FR012	Plano/Tarefas	Atraso na geração do universo corporativo.	Médio	-	Fechado	09 de janeiro	10 de janeiro
Problemas nas operações presentes na tabela de operações verdes	Tarefas	Atraso na geração dos satélites corporativos (83 e 84).	Médio	-	Fechado	11 de janeiro	31 de janeiro
Problemas nos inputs corporativos para o GAR	Tarefas	Atraso na geração do satélite 84.	Médio	Uso do <i>input</i> recebido em Junho23	Fechado	11 de dezembro	31 de janeiro
Risco na marcação da atividade associada a hipotecas com ano de construção > 2020	Plano/Tarefas	Impacto nos <i>timings</i> de implementação.	Médio	Definição de metodologia alternativa	Fechado	05 de janeiro	31 de janeiro

¹ Atividade com *ownership* Banco Santander.

Próximos Passos

Listagem de próximos passos

Apresentamos em seguida as próximas atividades a desenvolver até 15 de março e respectivos responsáveis:

ID	Âmbito	Atividades – 6 de janeiro a 15 de março	Responsável	Data Fecho
1	Geração dos <i>templates</i>	Processamento de alteração metodológicas e geração de informação		8 de março
2		Conciliação de informação contabilística		8 de março
3		Geração e carregamento de informação		12 de março



NE Y ON D

NEW WAYS TO GO BEYOND

WWW.NEYOND.PT
