



N E X O N D

NEW WAYS TO GO BEYOND

Reporting ESG Pilar III

Ponto de Situação #7



22 de fevereiro de 2024

Agenda

Objetivos

Realização da 7ª reunião de acompanhamento de projeto, de acordo com a seguinte ordem de atividades:

Sumário Executivo	Visão global sobre evolução da execução do projeto, riscos e dependências principais
Planeamento	Resumo do <i>status</i> das atividades a realizar ao longo do projeto
Esclarecimentos	Definição / discussão de temas identificados
Próximos Passos	Identificação das próximas atividades a desenvolver

Data

22 de fevereiro de 2024

Hora Início - Fim

16:00 – 17:00

Participantes



Susana Bernardo



Hugo Reia

Ana Rita Caguerelho

Dora Roxo


Helder Fernandes

Local

Microsoft Teams Call

Planeamento (1|2)

Plano de projeto

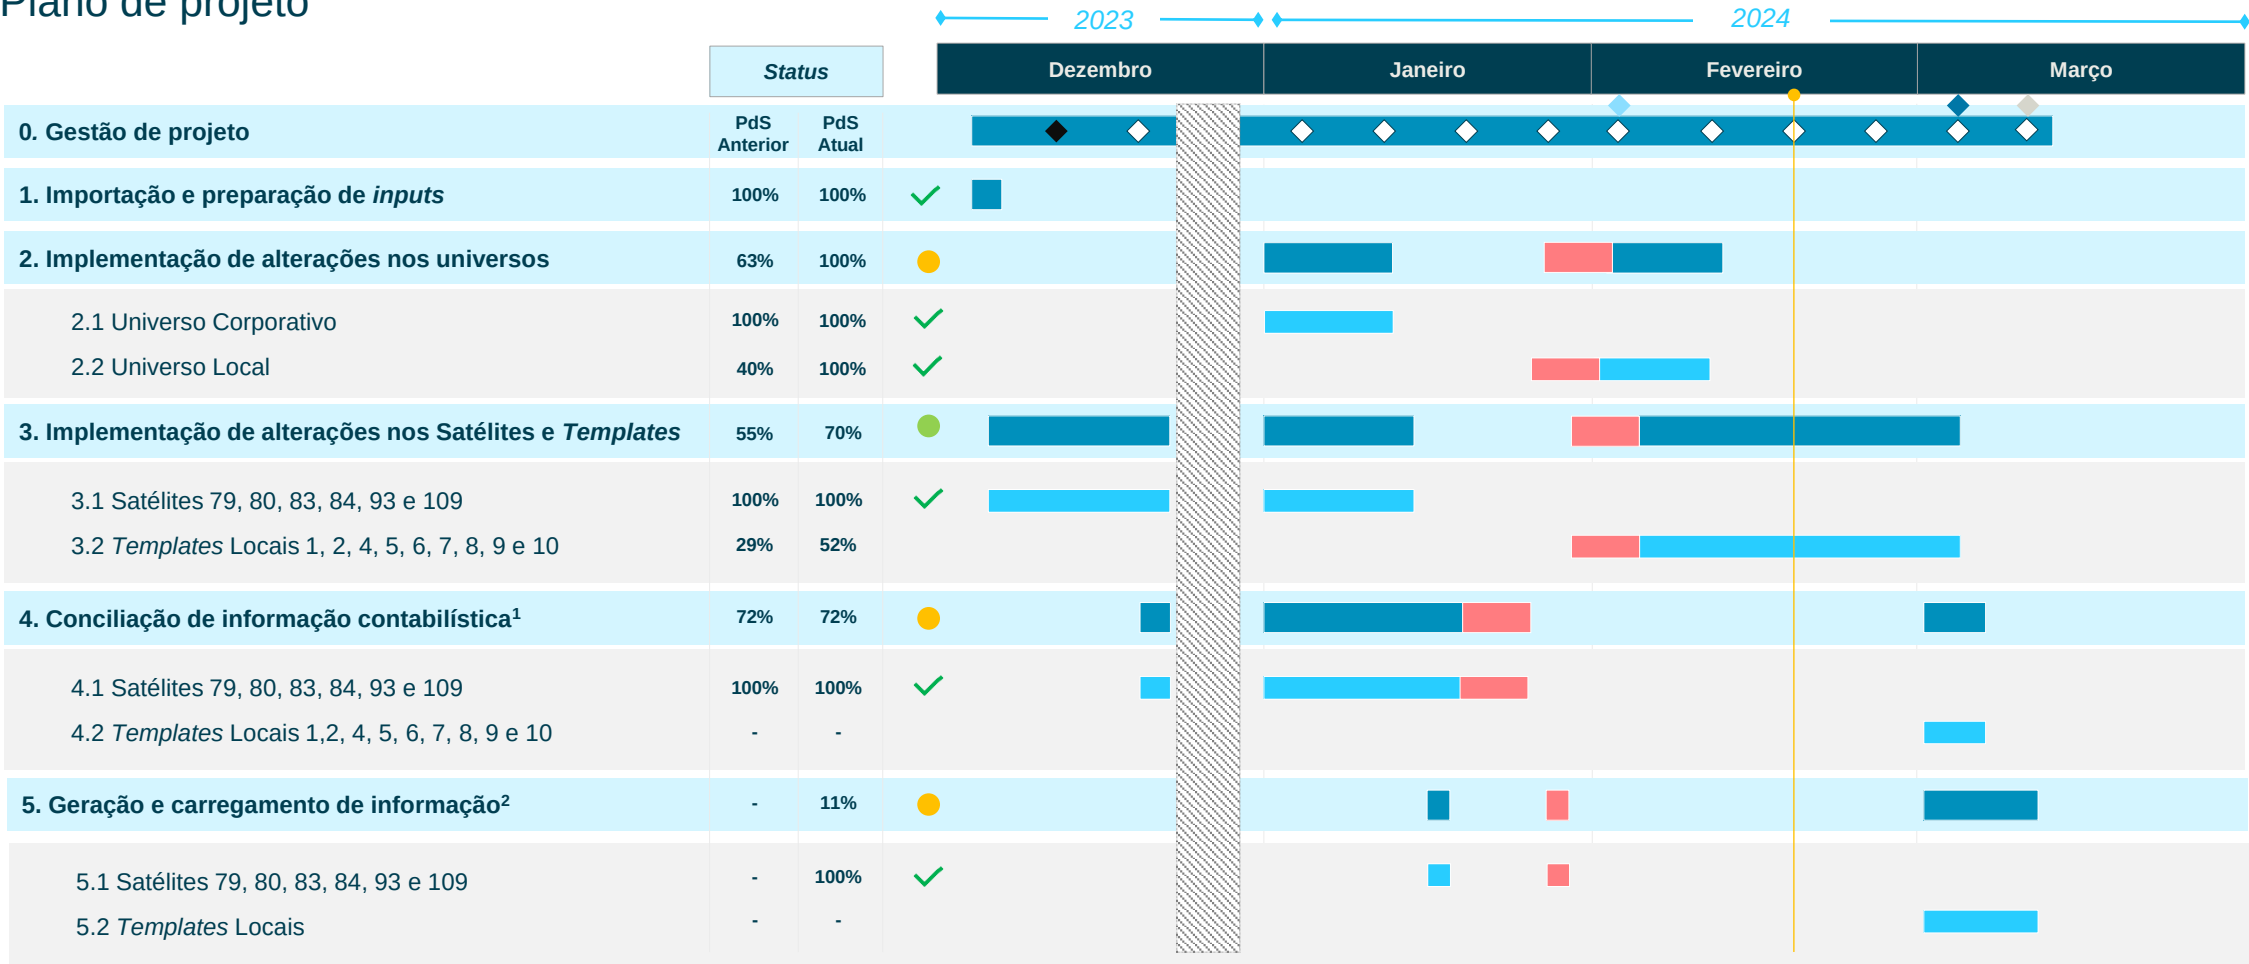

- Legenda:**
- ◆ Reunião de *Kick-off*
 - ◇ Reunião de PDS
 - ▨ *Freeze* do projeto
 - Atraso
 - 9 Fevereiro – Início de disponibilização dos templates
 - ◆ 8 Março – Última data da disponibiliza dos templates
 - ◆ 15 Março – Data da entrega dos templates ao regulador

- Sem atraso
- Atraso recuperável
- Atraso não recuperável
- Não aplicável

Notas: O projeto prevê um período de *freeze* de 22 de dezembro a 29 de dezembro de 2023.
¹ Atividades não executadas em virtude de procedimentos de conciliação corporativa face ao paralelo enviado pela Contabilidade.
² Detalhe apresentado no *slide* 5.

Planeamento (2|2)

Templates Locais

Seguem os *deadlines* para cada um dos *templates* locais:

<i>Templates</i>	Dependências	Data final prevista <i>input</i>	Data de entrega
<i>Templates 1,2 (STE)</i>	-	-	3 de Março
<i>Template 1,4</i>	-	-	22 de Fevereiro ✓
<i>Template 2</i>	-	-	9 de Fevereiro ✓
<i>Templates 5</i>	-	-	16 de Fevereiro ✓
<i>Templates 6,7</i>	-	-	7 de Março
<i>Template 8</i>	-	-	8 de Março
<i>Template 10</i>	-	-	16 de Fevereiro ✓

Riscos e desafios

Riscos e *Issues*

Seguem os principais *riscos e issues* identificados no decorrer das atividades realizadas:

Descrição	Tipo de impacto	Impacto	Nível de impacto	Medida de mitigação	Estado / Conclusão	Data Abertura	Data Fecho
Dúvidas funcionais acerca do mapeamento dos <i>templates</i>	Plano/Tarefas	Atrasos na geração dos <i>templates</i> devido atrasos na respostas da Corporação (<i>templates</i> 1, 4 e 7).	Alto	Definição de metodologia alternativa	Fechado	14 de fevereiro	20 de fevereiro
Dúvidas funcionais acerca do mapeamento dos <i>templates</i>	Plano/Tarefas	Atrasos na geração dos <i>templates</i> devido atrasos na respostas da Corporação (<i>templates</i> STE).	Alto	Definição de metodologia alternativa	Aberto ¹	14 de fevereiro	-

¹ Atividade com *ownership* Banco Santander.

Próximos Passos

Listagem de próximos passos

Apresentamos em seguida as próximas atividades a desenvolver até 15 de março e respectivos responsáveis:

ID	Âmbito	Atividades – 22 de fevereiro a 15 de março	Responsável	Data Fecho
1	Geração dos <i>templates</i>	Processamento de alteração metodológicas e geração de informação		8 de março
2		Conciliação de informação contabilística		8 de março
3		Geração e carregamento de informação		12 de março



NE Y ON D

NEW WAYS TO GO BEYOND

WWW.NEYOND.PT
