



N E Y O N D

NEW WAYS TO GO BEYOND

Reporting ESG Pilar III

Ponto de Situação #9



11 de março de 2024

Agenda

Objetivos

Realização da 9ª reunião de acompanhamento de projeto, de acordo com a seguinte ordem de atividades:

Sumário Executivo

Visão global sobre evolução da execução do projeto, riscos e dependências principais

Planeamento

Resumo do *status* das atividades a realizar ao longo do projeto

Esclarecimentos

Definição / discussão de temas identificados

Próximos Passos

Identificação das próximas atividades a desenvolver

Data

11 de março de 2024

Hora Início - Fim

10:00 – 11:00

Participantes



Susana Bernardo



Hugo Reia

Ana Rita Caguerelho

Dora Roxo

Helder Fernandes

Local

Microsoft Teams Call



Progresso ●

- Conclusão da implementação de alterações metodológicas e funcionais nos processos de geração de *templates*;
- Conclusão da geração do universo local;
- Conclusão de análises comparativas face aos exercícios de Jun23;
- Conclusão do processo de validação (ex. controlos vs GD);
- Conclusão de confronto com o XBRL;
- Continuação da documentação do processo.



Riscos ●

- Atrasos na entrega dos *templates* STE devido a atraso na resposta de conciliação por parte de CdG.



Próximos Passos


- Atualização da documentação com as alterações efetuadas sobre o processo durante o reporte de Dez23.

RAG STATUS

● Sem impactos ● Risco de impacto ● Impactos verificados

Planeamento (1|2)

Plano de projeto

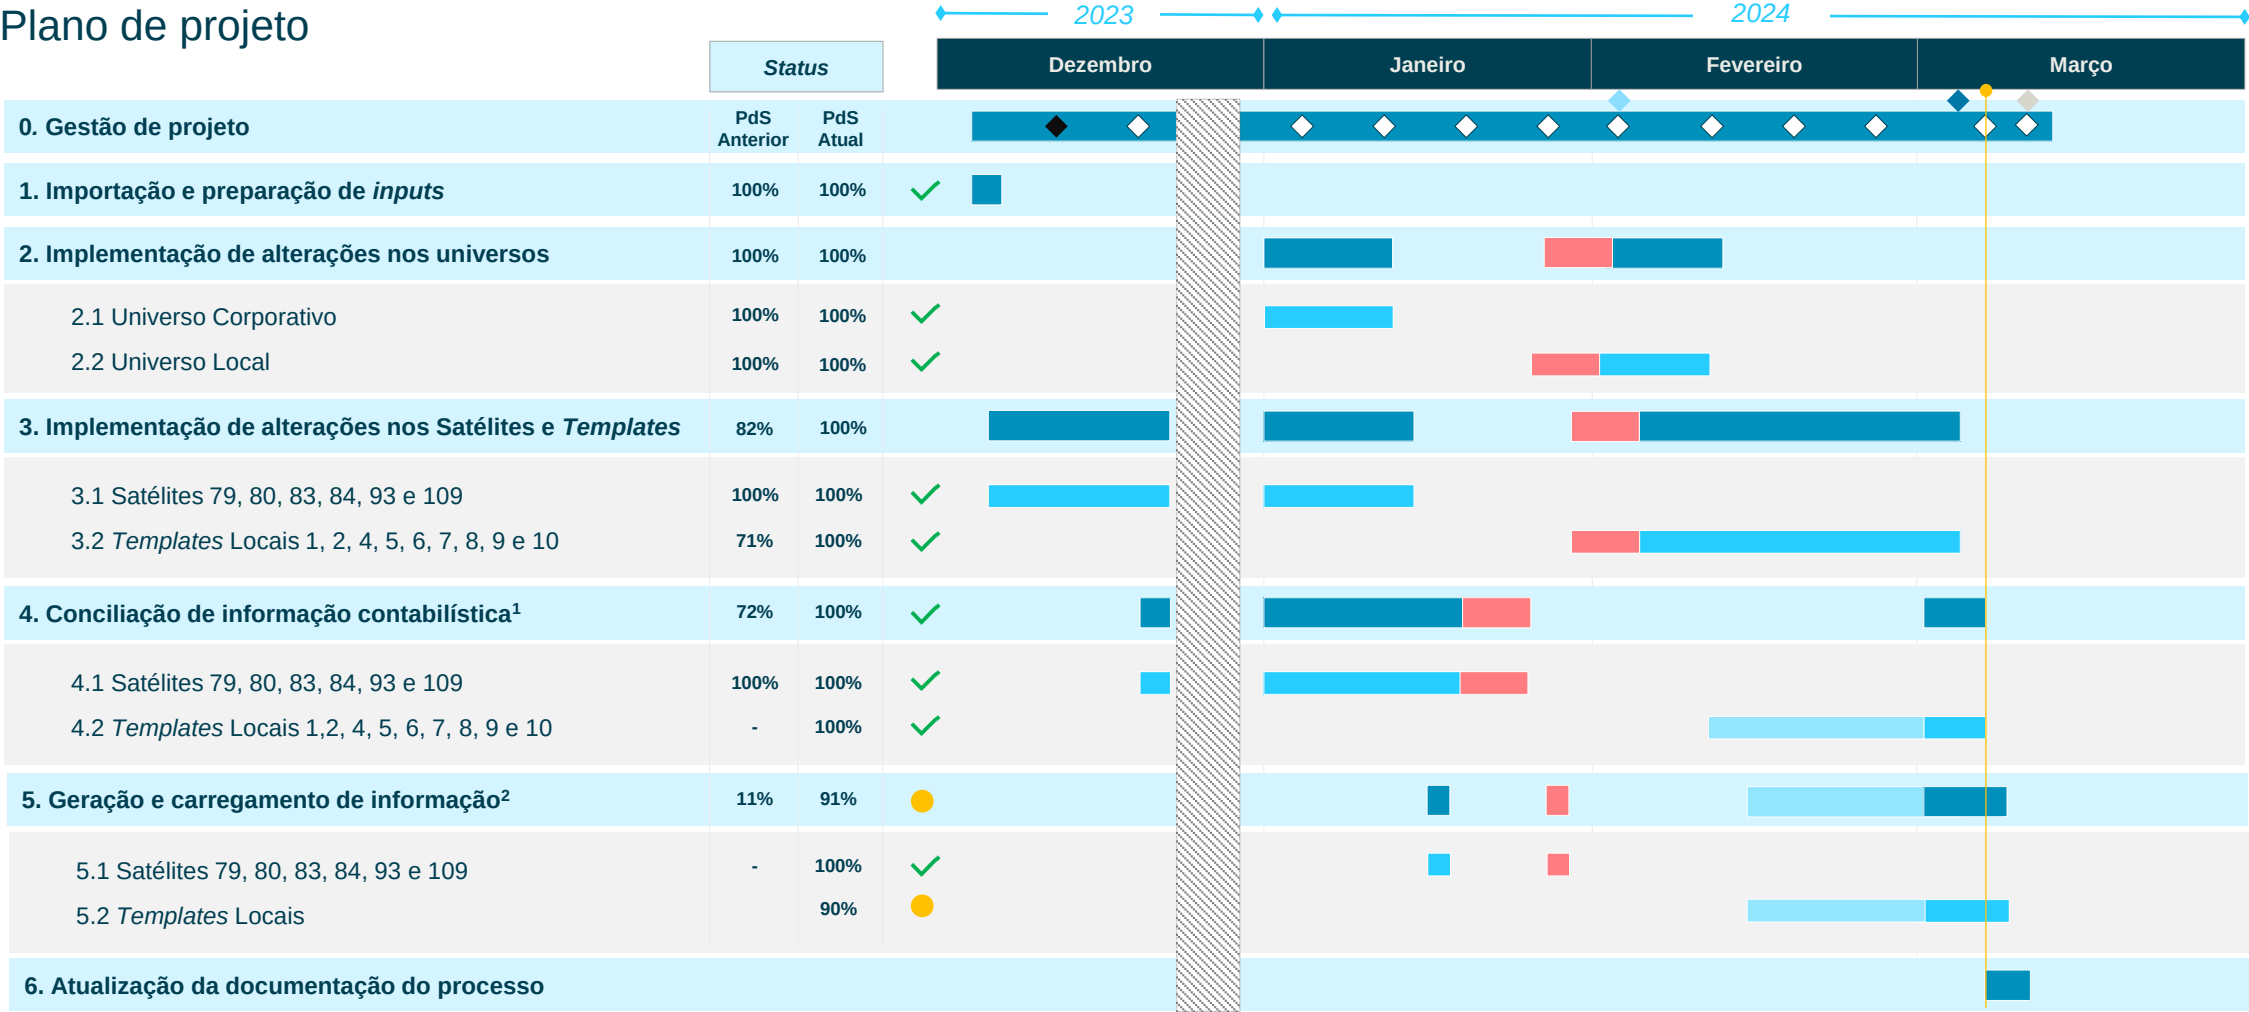

Legenda:

- Reunião de Kick-off
- Reunião de PDS
- 9 Fevereiro – Início de disponibilização dos templates
- Freeze do projeto
- Atraso
- 8 Março – Última data da disponibiliza dos templates
- 15 Março – Data da entrega dos templates ao regulador
- Antecipação de tarefa

Notas: O projeto prevê um período de freeze de 22 de dezembro a 29 de dezembro de 2023.

¹ Atividades não executadas em virtude de procedimentos de conciliação corporativa face ao paralelo enviado pela Contabilidade.

² Detalhe apresentado no slide 5.

- Sem atraso
- Atraso recuperável
- Atraso não recuperável
- Não aplicável

Planeamento (2|2)

Templates Locais

Seguem os *deadlines* para cada um dos *templates* locais:

<i>Templates</i>	Dependências	Data final prevista <i>input</i>	Data de entrega
<i>Templates 1,2 (STE)</i>	Atraso na reconciliação Mis-Contab por parte de CdG (6 de Março)	-	1 de Março (12 de Março versão reconciliada)
<i>Template 1,4</i>	-	-	22 de Fevereiro ✓
<i>Template 2</i>	-	-	9 de Fevereiro ✓
<i>Templates 5</i>	-	-	16 de Fevereiro ✓
<i>Templates 6,7</i>	-	-	7 de Março ✓
<i>Template 8</i>	-	-	8 de Março ✓
<i>Template 10</i>	-	-	16 de Fevereiro ✓

Riscos e desafios

Riscos e *Issues*

Seguem os principais **riscos e issues** identificados no decorrer das atividades realizadas:

Descrição	Tipo de impacto	Impacto	Nível de impacto	Medida de mitigação	Estado / Conclusão	Data Abertura	Data Fecho
Ajustes contabilísticos a incidir sobre os <i>templates</i> STE	Plano/Tarefas	Atraso na reconciliação Mis-Contab por parte de CdG (6 de Março)	Alto	Envio de versão preliminar sem ajustes	Aberto	28 de fevereiro	-

¹ Atividade com *ownership* Banco Santander.

Próximos Passos

Listagem de próximos passos

Apresentamos em seguida as próximas atividades a desenvolver até 15 de março e respetivos responsáveis:

ID	Âmbito	Atividades – 22 de fevereiro a 15 de março	Responsável	Data Fecho
1	Geração dos <i>templates</i>	Processamento de alteração metodológicas e geração de informação		8 de março
2		Conciliação de informação contabilística		8 de março
3		Geração e carregamento de informação		12 de março
4	Documentação	Atualização da documentação com as alterações efetuadas sobre o processo durante o reporte de Dez23		15 de março



NE Y ON D

NEW WAYS TO GO BEYOND

WWW.NEYOND.PT
