NEXOND

NEW WAYS TO GO BEYOND

Implementação *Templates* Locais ESG Pilar III

Reunião de *Kick-Off*

Santander

25 Março 2025

Agenda

Objetivos

Efetuar a reunião de *kick-off* de projeto, de acordo com a seguinte ordem de trabalhos:

Objetivos e âmbito	Alinhamento dos principais objetivos e âmbito do projeto
Planeamento e organização	Apresentação dos principais pontos relativos à organização e planeamento para o projeto
Próximos passos	Identificação das principais atividades a definir durante este *kick-off* e a realizar nos próximos dias

Participantes

Santander

- Susana Bernardo

NEXOND
NEW WAYS TO GO BEYOND

- Luís Godinho
- Diogo Escaleira
- Rita Caguerelho
- João Galhardo

Data	Hora Início - Fim	Local
25 de Março de 2025	14:30 – 15:00	Microsoft Teams

Objetivos e Âmbito

Enquadramento | Pilar III em ESG & SREP/STE

O Art. 449a da CRR levou a que a EBA desenvolvesse um conjunto de *standards* técnicos (ITS) que especificam as divulgações do Pilar 3 sobre a ESG, permitindo desta forma, em conjunto com outros *reports*/exercícios, agregar informação comparável sobre perfil de risco das instituições .

Pilar III em ESG

Informação Quantitativa

Template 1 – *Credit quality of exposures by sector, emissions and residual maturity*

Template 2 – *Loans collateralised by immovable property - Energy efficiency of the collateral*

Template 3 – *Climate change transition risk: Alignment metrics*

Template 4 – *Exposures to top 20 carbon-intensive firms*

Template 5 – *Exposures subject to physical risk*

Template 6 – *Summary of GAR (green asset ratio) KPIs*

Template 7 – *Assets for the calculation of GAR*

Template 8 – *GAR (%) (climate change mitigation, climate change adaptation and client type)*

Template 9 – *BTAR (Banking book Taxonomy Alignment Ratio)*

Template 10 – *Other climate change mitigating actions (beyond GAR)*

Informação Qualitativa

Tabela 1 – *Qualitative information on Environmental risk*

Tabela 2 – *Qualitative information on Social risk*

Tabela 3 – *Qualitative information on Governance risk*

SREP/STE em Pilar III

Informação Quantitativa

Template 1 – *Credit quality of exposures by interest income and emissions*

Template 2 – *Loans collateralised - Energy efficiency of the collateral*

Template 3 – *Exposures to counterparties*

Âmbito de projeto

- 3 riscos de transição
- 1 risco físico
- 5 riscos de mitigação

SREP/ STE 3 relatórios

12 RELATÓRIOS

Legenda: Riscos de transição | Riscos físicos | Mitigação | Fora de âmbito | Âmbito de projeto

Objetivos e Âmbito

Objetivos e âmbito

Objetivos do projeto

O projeto tem como **objetivo**, desenvolver a especificação funcional, respetiva certificação e implementação do **processo de geração dos *Templates Locais*** do **Pilar III em ESG & SREP** tendo como bases o ***Loan Tape* Pilar III** (carteira de crédito) **e Modelos ESG** (Modelo Verde/Modelo de Bens Imóveis)

Âmbito do projeto

<u>Especificação de requisitos</u>

- Identificação de universos a reportar pelos **12 *Templates* Locais**;
- Definição e *mapping* de conceitos a reportar em formato de *Template* Local.

<u>Implementação e Certificação de *Templates* Locais:</u>

- Implementação de solução de geração dos reportes (ODBC) e *Stored Procedure* no *Data Lake*;
- Realização de paralelos com reporte tático de dezembro de 2024;
- Documentação do processo.

FONTES DE APROVISIONAMENTO

LOAN TAPE – Pilar III

<u>Carteira de crédito</u> (Granular – Contrato, Clientes e Garantias)

MODELOS ESG

Modelo Verde &
Modelo de Bens Imóveis

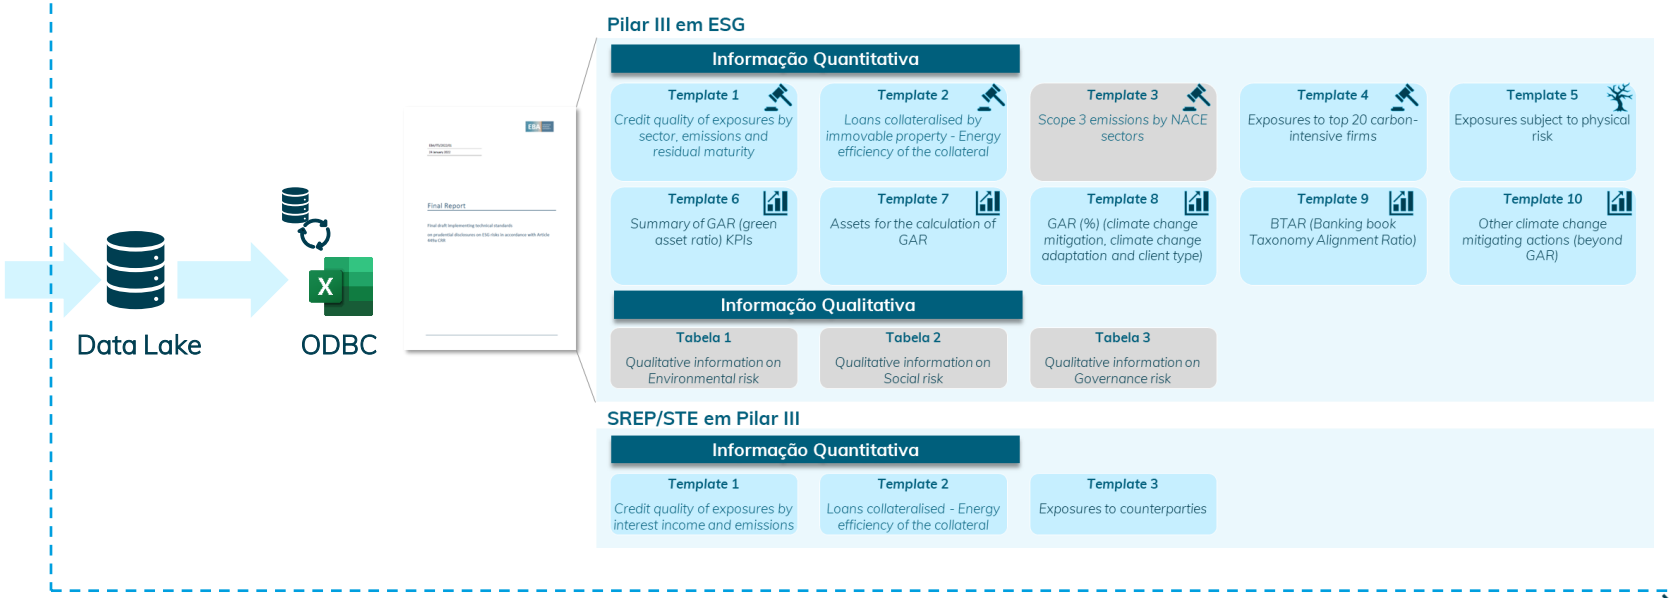

Legenda: Fora de âmbito | Âmbito de projeto | Geração de tabela granular no DL via *Stored Procedure* | Processo de geração de *templates* via ODBC

Planeamento e Organização

Planeamento

A duração estimada para o projeto sob o âmbito de Especificação e Implementação dos *Templates* Locais de ESG em Pilar III & SREP/STE de acordo com o seguinte plano:

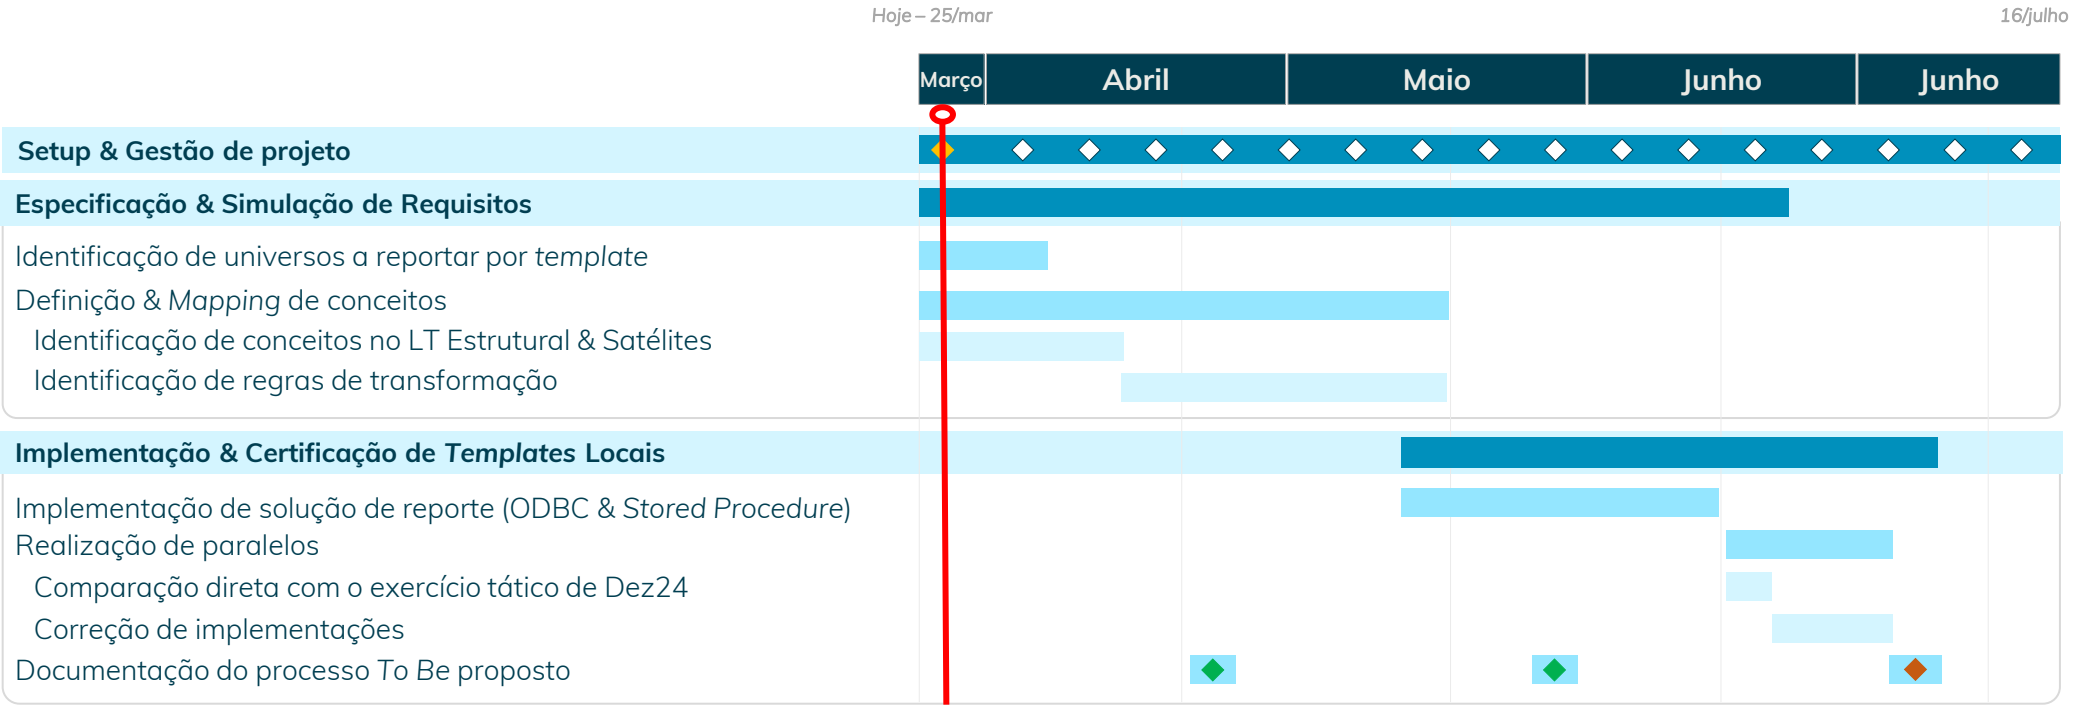

Legenda: ◆ Reunião de *Kickoff* ◇ Reunião de PDS ▨ Continuidade T&M a avaliar findo projeto(*Time and Materials*) ◆ Documentação preliminar ◆ Documentação final

Planeamento e Organização

Equipa de projeto

Direção de projeto

Comité de acompanhamento

Santander	NEXOND
Susana Bernardo	Luís Godinho

Equipa de projeto

Comité operacional

Santander	NEXOND
Susana Bernardo	Diogo Escaleira

Equipa de projeto

Santander	NEXOND
Susana Bernardo	Rita Caguerelho João Galhardo

Planeamento e Organização

Modelo de governance

De seguida propomos um modelo de *governance* e respetiva *framework* de responsabilidades da gestão e equipa de projeto, onde pretendemos garantir que estão reunidas todas as condições para a tomada de decisão e prossecução dos *milestones* propostos no projeto.

	Principais objetivos a endereçar	Formato e suportes a utilizar	Equipas / Entidades / *Stakeholders* participantes
PDS **A definir**	• Ponto de situação do projeto • Revisão do plano de trabalho • Principais aspetos a acautelar • Tomada de decisões operacionais de projeto • Revisão de outputs intermédios/finais	**Reuniões presenciais/online** ***Status* das atividades, *Issues* e *Riscos***	**Sponsor do projeto** Santander ○ **Partner do projeto** NEXOND ● **Direção de projeto** Santander ◐ **Direção de projeto** NEXOND ◐ **Equipa de projeto** NEXOND Santander ◐

Legenda:
- ◐ Participação mandatória
- ○ Sem participação
- ● Participação opcional e sempre que necessário

Próximos passos

No seguimento do plano previamente apresentado, enumeramos as próximas atividades de projeto a desenvolver até ao dia **4 de abril**:

ID	Atividades	Owner
#1	Agendamento das reuniões de ponto de situação do projeto.	NEXOND, Santander
#2	Reunião com a equipa corporativa para clarificação da metodologia de cálculo de emissões financiadas. – **Reunião agendada para dia 31/03/2024**	NEXOND, Santander
#3	Instalação de ODBC associado aos users dos elementos da equipa de projeto. – ***Tickets* aberto – a aguardar resposta da informática**	NEXOND, Santander
#4	Agendamento de reunião com a equipa de tecnologia para avaliar disponibilidade para implementação do cálculo de emissões financiadas nos Modelos ESG.	NEXOND
#5	Definição da parametrização para obtenção do universo de reporte local para implementação de tecnologia.	NEXOND

NEYOND

NEW WAYS TO GO BEYOND

WWW.NEYOND.PT
