NEXOND

NEW WAYS TO GO BEYOND

Implementação Templates Locais & Satélites Corporativos

Ponto de Situação #1

Santander

3 de abril de 2025

Agenda

Objetivos

Realização da 1ª reunião de acompanhamento de projeto, de acordo com a seguinte ordem de atividades:

Sumário Executivo	Visão global sobre evolução da execução do projeto, riscos e dependências principais
Planeamento	Resumo do *status* das atividades a realizar ao longo do projeto
Esclarecimentos	Definição / discussão de temas identificados
Próximos Passos	Identificação das próximas atividades a desenvolver

Participantes

Santander

Susana Bernardo

NEXOND
NEW WAYS TO GO BEYOND

Diogo Escaleira

Ana Rita Caguerelho

João Galhardo

Data	Hora Início - Fim	Local
3 de abril de 2024	12:00 – 13:00	*Microsoft Teams Call*

Sumário Executivo

Progresso

- Realização de reunião para alinhamento de calendário de entregas de informação de adjudicados;
- Realização de reunião para alinhamento de calendário de entregas de informação de emissões financiadas e alinhamento da estrutura da tabela de informação;
- Instalação de ODBC;
- Início da especificação de requisitos para o cálculo de emissões financiadas;
- Início da definição da tabela de parametrização de universo Local.

Riscos e desafios

- Disponibilização de adjudicados;
- Disponibilização da informação de emissões financiadas.

Dependências

- Tecnologia.

RAG STATUS

Sem impactos *Risco de impacto* *Impactos verificados*

Planeamento e Organização

Planeamento

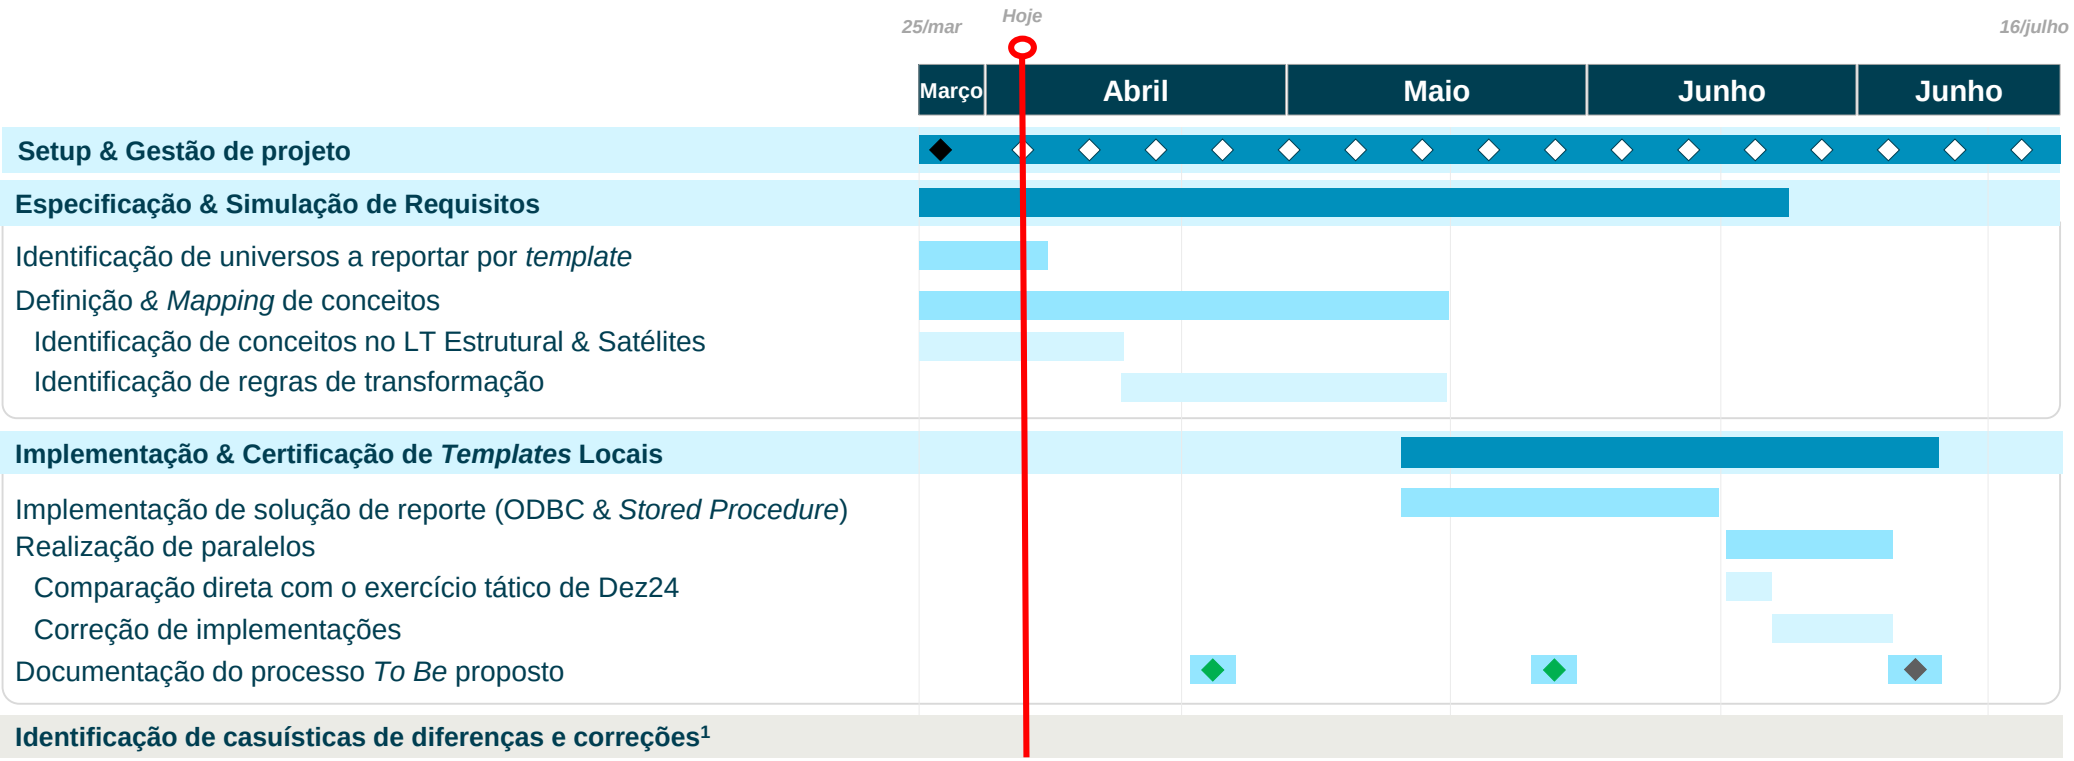

[1]A padronização de diferenças por casuísticas deverá ser avaliada no final deste projeto numa lógica de ***Time and Materials*** dada a imprevisibilidade de estimação da mesma

Legenda: ◆ Reunião de *Kickoff* ◇ Reunião de PDS ◆ Documentação preliminar ◆ Documentação final

Riscos e desafios

Riscos e *Issues*

Seguem os principais ***riscos* e *issues*** identificados no decorrer das atividades realizadas:

Descrição	Tipo de impacto	Impacto	Nível de impacto	Medida de mitigação	Estado / Conclusão	Data Abertura	Data Fecho
Adjudicados	Tarefas	A não receção da informação no *Data Lake* poderá impactar os reportes Local e Corporativo.	**Alto**	Definir metodologia alternativa de aprovisionamento da informação.	**Aberto[1]**	**3 de abril**	**-**
Emissões financiadas	Tarefas	A não receção da informação no *Data Lake* poderá impactar os reportes Local e Corporativo.	**Alto**	Definir metodologia alternativa de aprovisionamento da informação.	**Aberto[1]**	**3 de abril**	**-**

[1] Atividade com *ownership* Banco Santander e Tecnologia.

Próximos Passos

Listagem de próximos passos

Apresentamos em seguida as próximas atividades a desenvolver até 11 de abril e respetivos responsáveis:

ID	Âmbito	Atividades – 4 de abril a 11 de abril	Responsável	Data Fecho
1	**Templates Locais**	Continuação da especificação metodológica do cálculo de emissões financiadas.	NEXOND	**11 de abril**
2		Finalização da definição da tabela de parametrização de universo Local.	NEXOND	**11 de abril**
3		Início do *mapping* de conceitos e adaptação dos códigos existentes ao nível das bases granulares.	NEXOND	**24 de abril**

NEYOND

NEW WAYS TO GO BEYOND

WWW.NEYOND.PT
