NEXOND

NEW WAYS TO GO BEYOND

Implementação Templates Locais & Satélites Corporativos

Ponto de Situação #3

Santander

23 de abril de 2025

Agenda

Objetivos

Realização da 3ª reunião de acompanhamento de projeto, de acordo com a seguinte ordem de atividades:

Sumário Executivo	Visão global sobre evolução da execução do projeto, riscos e dependências principais
Planeamento	Resumo do *status* das atividades a realizar ao longo do projeto
Esclarecimentos	Definição / discussão de temas identificados
Próximos Passos	Identificação das próximas atividades a desenvolver

Participantes

Santander

Susana Bernardo

NEXOND
NEW WAYS TO GO BEYOND

Diogo Escaleira

Ana Rita Caguerelho

Henrique Correia

João Galhardo

Data	Hora Início - Fim	Local
23 de abril de 2025	12:00 – 13:00	*Microsoft Teams Call*

Sumário Executivo

Progresso

- Conclusão da especificação de requisitos para o cálculo de emissões financiadas;
- Reunião para alinhamento da parametrização do universo local na tabela AG801;
- Continuação do *mapping* de conceitos de bases granulares e *Template 2*;
- Finalização do *mapping* de conceitos e continuação das alterações de *script* de forma a incorporar as bases estruturais no processo de geração do Satélite 79.

Riscos e desafios

- Disponibilização de adjudicados;
- Disponibilização da informação de emissões financiadas.
- Disponibilização da tabela de parametrização de Universo - *ag801_param_satel_univ*

Dependências

- Tecnologia.

Legenda

Sem impactos *Risco de impacto* *Impactos verificados*

Planeamento (1|4)

Plano de projeto – Implementação *Templates* Locais

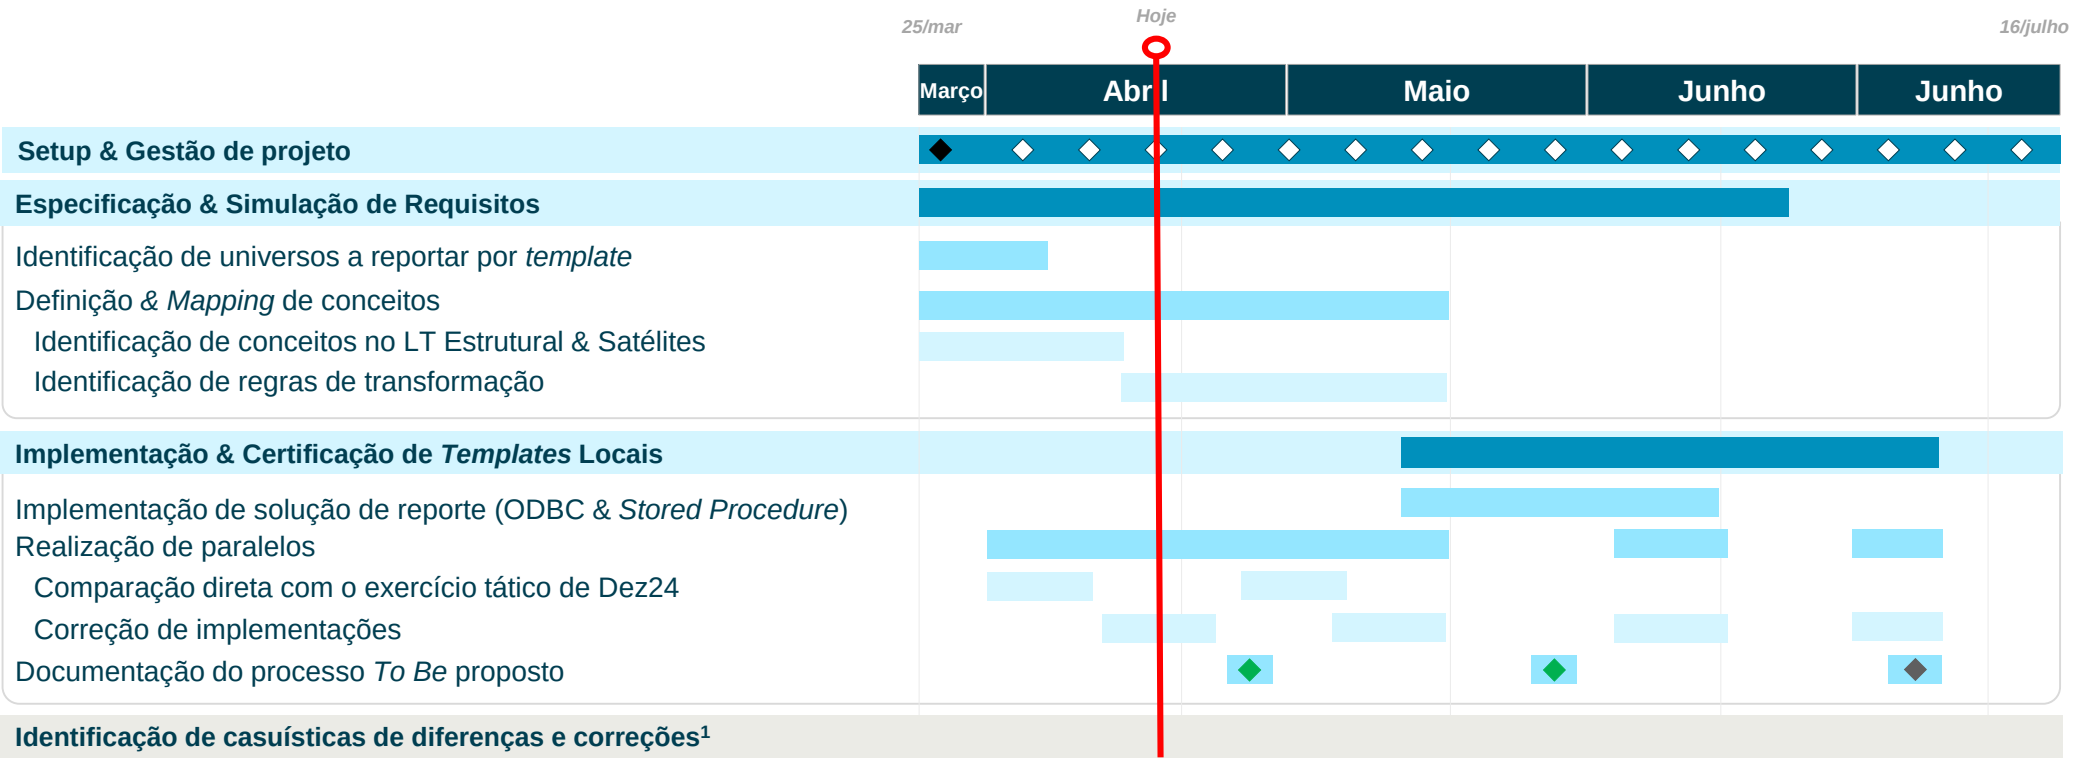

[1]A padronização de diferenças por casuísticas deverá ser avaliada no final deste projeto numa lógica de ***Time and Materials*** dada a imprevisibilidade de estimação da mesma

Legenda: ◆ Reunião de *Kickoff* ◇ Reunião de PDS ◆ Documentação preliminar ◆ Documentação final

Planeamento (2|4)

Plano de entregas – *Templates* Locais

Templates	Dependências	Data final prevista *input*	Data de entrega[1]
Templates 1 (STE)	-	-	20 de junho
Templates 2 (STE)	-	-	16 de maio
Template 1	-	-	6 de junho
Templates 2	-	-	13 de maio
Template 4	-	-	29 de maio
Template 5	-	-	19 de maio
Templates 6,7,8,9	-	-	22 de maio
Template 10	-	-	27 de junho

[1]O plano apresentado não inclui a inclusão do universo de adjudicados.

Planeamento (3|4)

Plano de projeto – Implementação Satélites Corporativos

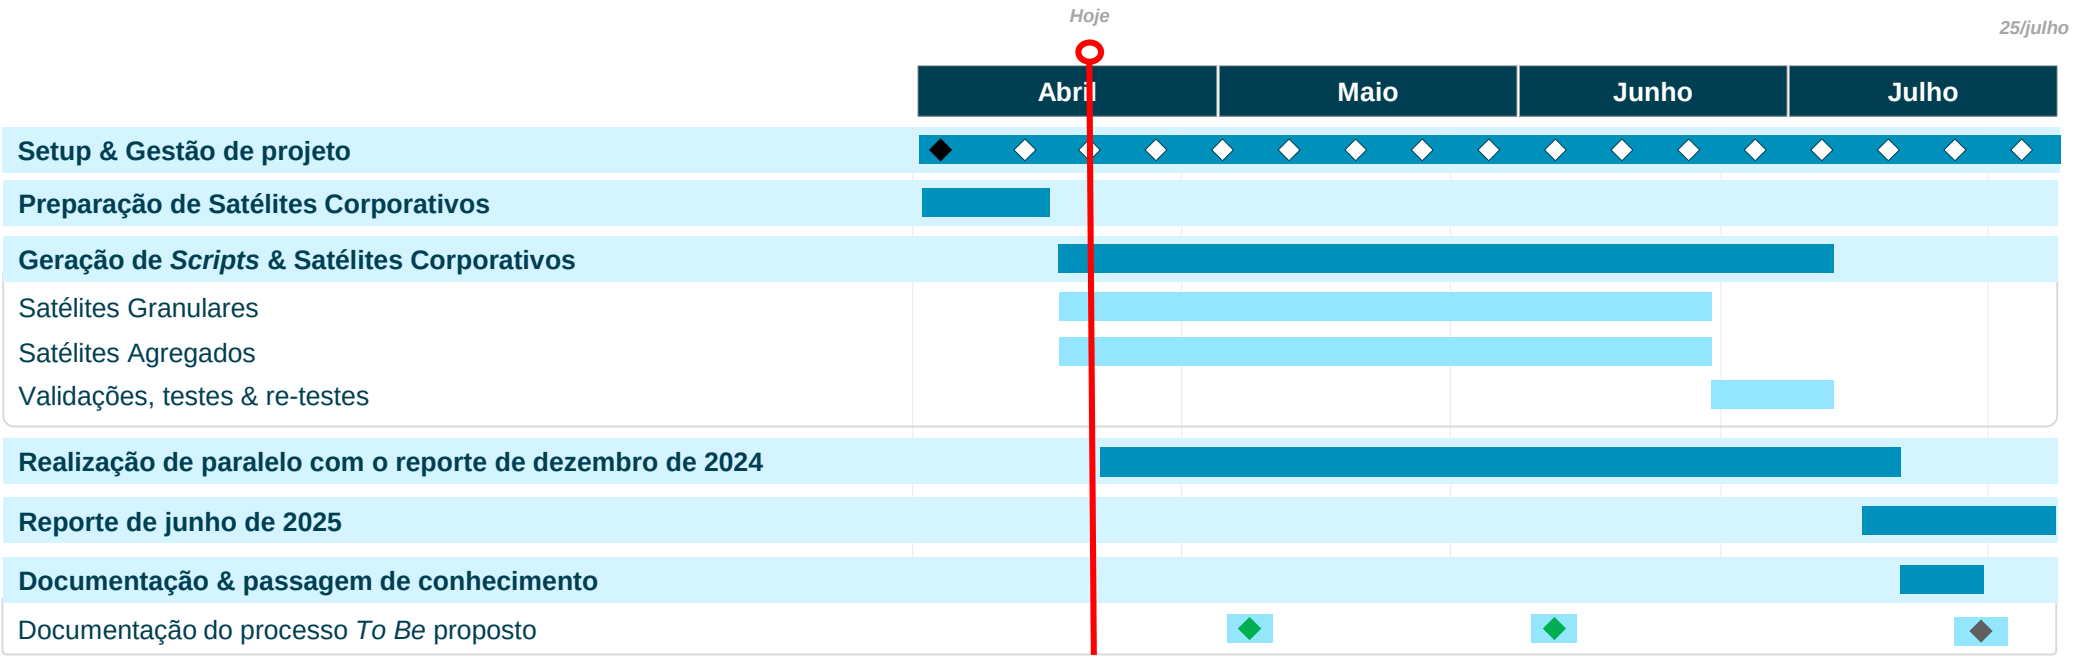

Identificação de casuísticas de diferenças e correções[1]

[1]A padronização de diferenças por casuísticas deverá ser avaliada no final deste projeto numa lógica de ***Time and Materials*** dada a imprevisibilidade de estimação da mesma

Legenda: ◆ Reunião de *Kickoff* ◇ Reunião de PDS ◆ Documentação preliminar ◆ Documentação final

Planeamento (4|4)

Plano de entregas – Satélites Corporativos

Templates	Dependências	Data final prevista *input*	Data de entrega[1]
Satélite 79	-	-	13 de maio
Satélite 80	-	-	16 de maio
Satélite 83	-	-	29 de maio
Satélite 84	-	-	22 de maio
Satélite 93	-	-	6 de junho
Satélite 109	-	-	13 de junho

[1]O plano apresentado não inclui a inclusão do universo de adjudicados.

Riscos e desafios

Riscos e *Issues*

Seguem os principais ***riscos* e *issues*** identificados no decorrer das atividades realizadas:

Descrição	Tipo de impacto	Impacto	Nível de impacto	Medida de mitigação	Estado / Conclusão	Data Abertura	Data Fecho
Imóveis Adjudicados	Tarefas	A não receção da informação no *Data Lake* poderá impactar os reportes Local e Corporativo. – A aguardar entrega de calendário	**Alto**	Definir metodologia alternativa de aprovisionamento da informação.	**Aberto[1]**	**3 de abril**	**-**
Emissões financiadas	Tarefas	A não receção da informação no *Data Lake* poderá impactar os reportes Local e Corporativo. – A aguardar entrega de calendário	**Alto**	Definir metodologia alternativa de aprovisionamento da informação.	**Aberto[1]**	**3 de abril**	**-**
Disponibilização da tabela de parametrização de Universo - ag801_param_satel_univ	Tarefas	A não receção da informação no *Data Lake* poderá impactar os reportes Local e Corporativo. – A aguardar entrega de calendário	**Alto**	Definir metodologia alternativa de aprovisionamento da informação.	**Aberto[1]**	**10 de abril**	**-**

[1] Atividade com *ownership* Banco Santander e Tecnologia.

Próximos Passos

Listagem de próximos passos

Apresentamos em seguida as próximas atividades a desenvolver até 24 de abril e respetivos responsáveis:

ID	Âmbito	Atividades – 18 de abril a 24 de abril	Responsável	Data Fecho
1	**Templates Locais**	Conclusão do *mapping* de conceitos e adaptação dos códigos existentes ao nível das bases granulares.	NEXOND	**24 de abril**
2		Conclusão do *mapping* de conceitos e adaptação dos códigos existentes ao nível do STE2.	NEXOND	**24 de abril**
3		Início do *mapping* de conceitos e adaptação dos códigos existentes ao nível do *Template* 2.	NEXOND	**24 de abril**
4	**Satélites Corporativos**	Finalização do *mapping* de conceitos e alterações dos códigos existentes de forma a incorporar as bases estruturais no processo de geração do satélite 79.	NEXOND	**24 de abril**
5		Continuação do *mapping* de conceitos e alterações dos códigos existentes de forma a incorporar as bases estruturais no processo de geração dos restantes satélites agregados.	NEXOND	**-**

NEYOND

NEW WAYS TO GO BEYOND

WWW.NEYOND.PT
