NEXOND

NEW WAYS TO GO BEYOND

Implementação Templates Locais & Satélites Corporativos

Ponto de Situação #5

Santander

15 de maio de 2025

Agenda

Objetivos

Realização da 5ª reunião de acompanhamento de projeto, de acordo com a seguinte ordem de atividades:

Sumário Executivo	Visão global sobre evolução da execução do projeto, riscos e dependências principais
Planeamento	Resumo do *status* das atividades a realizar ao longo do projeto
Esclarecimentos	Definição / discussão de temas identificados
Próximos Passos	Identificação das próximas atividades a desenvolver

Participantes

Santander

Susana Bernardo

NEXOND
NEW WAYS TO GO BEYOND

Diogo Escaleira

Hélder Fernandes

Pedro Natário

João Galhardo

Data	Hora Início - Fim	Local
15 de maio de 2025	12:00 – 13:00	*Microsoft Teams Call*

Sumário Executivo

Progresso

- Início dos testes à tabela de cálculo de emissões financiadas;
- Finalização do *mapping* de conceitos e continuação das alterações de *script* do *Template 2 STE*;
- Finalização das alterações de *script* do *Template* 2 *EBA* e ajustes finais da documentação *word* e início da preparação do paralelo com o exercício tático de dezembro 2024;
- Finalização das alterações de *script* do satélite 79 e ajustes estruturais da documentação *word* e do paralelo com o exercício tático de dezembro 2024;
- Finalização do *mapping* de conceitos e das alterações de *script* do satélite 80 e início da preparação do paralelo com o exercício tático de dezembro 2024

Riscos e desafios

- Disponibilização de adjudicados (4/4);
- Disponibilização da tabela de parametrização de Universo - *ag801_param_satel_univ*

Dependências

- Tecnologia.

Legenda

Sem impactos *Risco de impacto* *Impactos verificados*

Planeamento (1|3)

Plano de projeto – Implementação *Templates* Locais

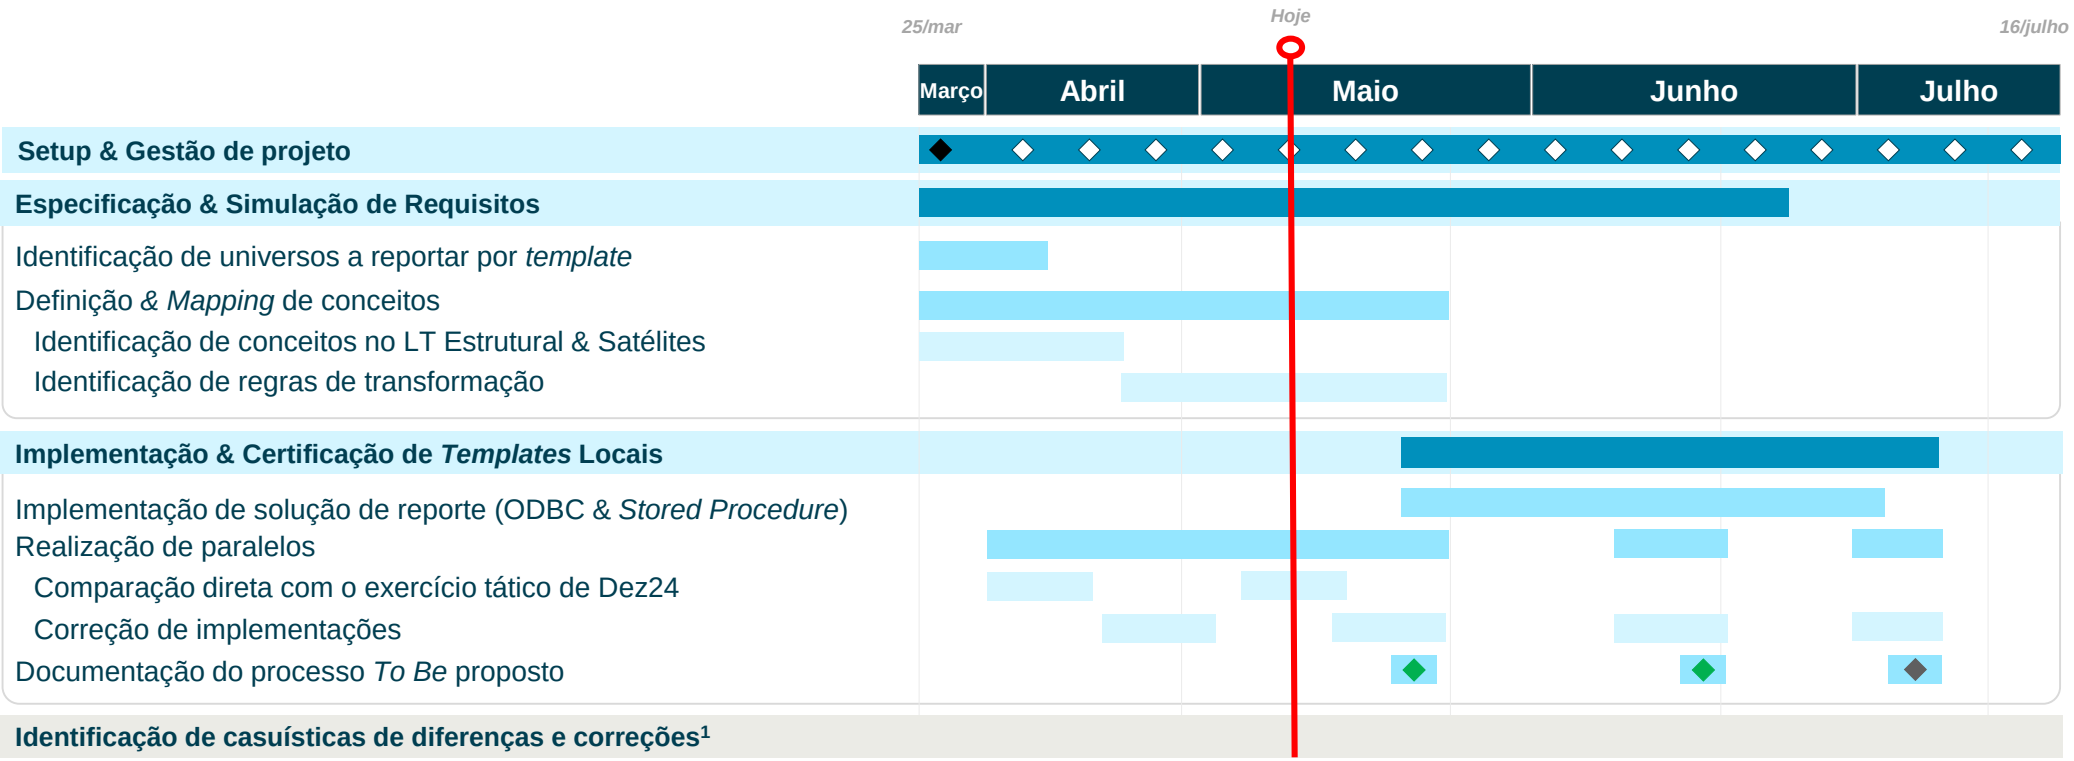

[1]A padronização de diferenças por casuísticas deverá ser avaliada no final deste projeto numa lógica de ***Time and Materials*** dada a imprevisibilidade de estimação da mesma

Legenda: ◆ Reunião de *Kickoff* ◇ Reunião de PDS ◆ Documentação preliminar ◆ Documentação final

Planeamento (2|3)

Plano de projeto – Implementação Satélites Corporativos

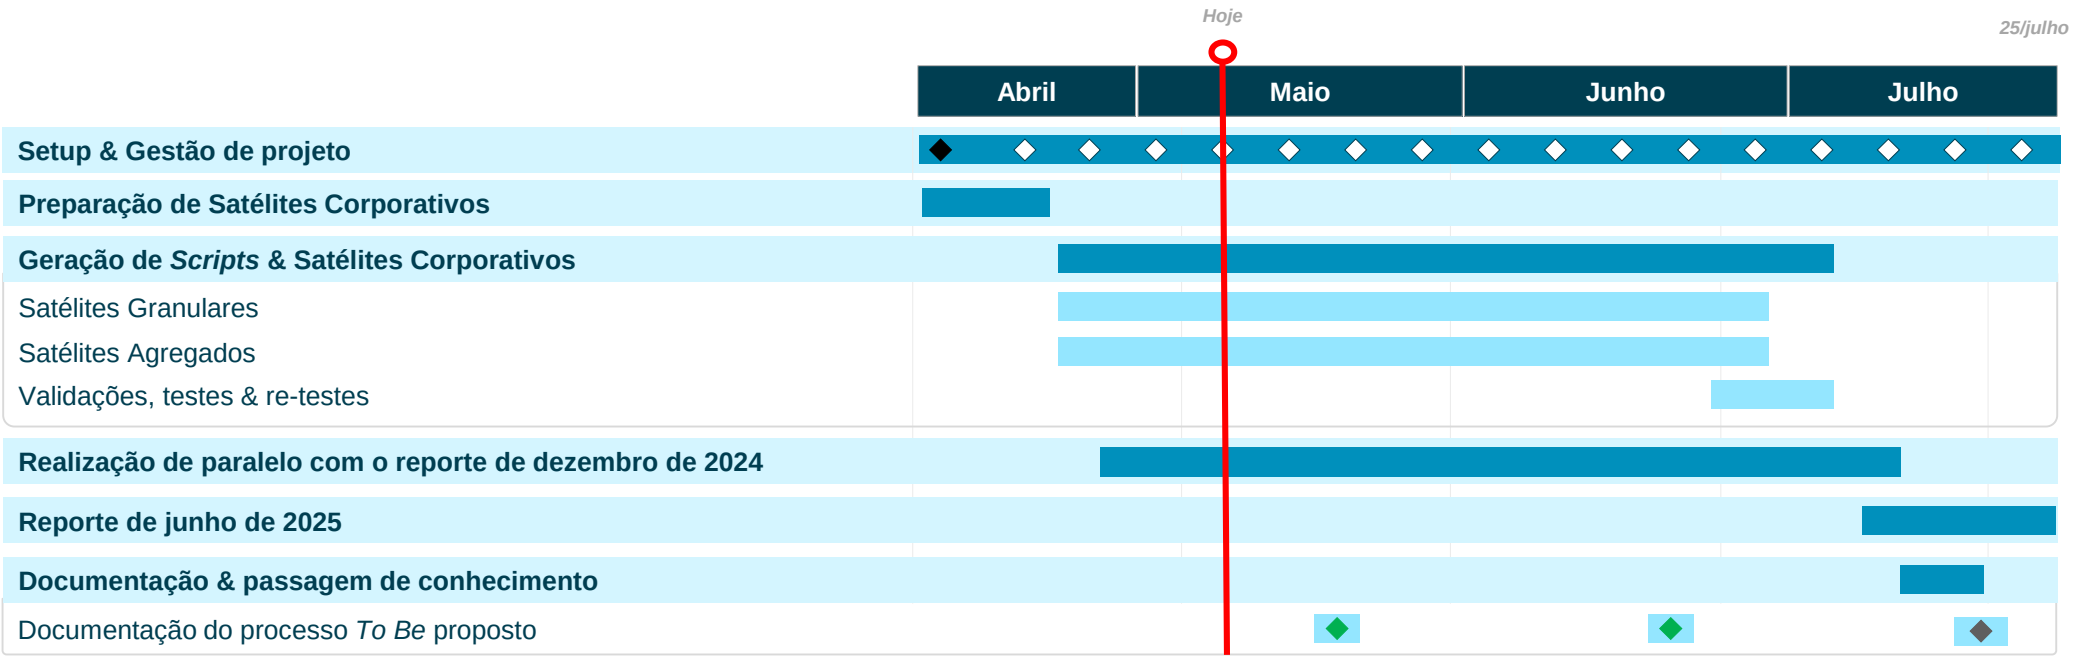

Identificação de casuísticas de diferenças e correções[1]

[1]A padronização de diferenças por casuísticas deverá ser avaliada no final deste projeto numa lógica de ***Time and Materials*** dada a imprevisibilidade de estimação da mesma

Legenda: ◆ Reunião de *Kickoff* ◇ Reunião de PDS ◆ Documentação preliminar ◆ Documentação final

Planeamento (3|3)

Plano de entregas – *Templates* Locais & Satélites Corporativos

Templates	Data de entrega[1]
Templates 1 (STE)	4 de julho
Templates 2 (STE)	22 de maio
Template 1	4 de julho
Templates 2	16 de maio
Template 4	6 de junho
Template 5	27 de maio
Templates 6,7,8,9	30 de maio
Template 10	17 de junho

Satélites	Data de entrega[1]
Satélite 79	23 de maio
Satélite 80	16 de maio
Satélite 83	17 de junho
Satélite 84	30 de maio
Satélite 93	27 de junho
Satélite 109	23 de junho

[1]O plano apresentado não inclui a inclusão do universo de adjudicados.

Próximos Passos

Listagem de próximos passos

Apresentamos em seguida as próximas atividades a desenvolver até 22 de maio e respetivos responsáveis:

ID	Âmbito	Atividades – 15 de maio a 22 de maio	Responsável	Data Fecho
1	**Templates Locais**	Finalização do *mapping* de conceitos e adaptação dos códigos existentes ao nível do STE2.	NEXOND	**22 de maio**
2		Finalização do *mapping* de conceitos e adaptação dos códigos existentes ao nível do *Template* 2 e realização dos paralelos com o reporte tático de dezembro 2024. Sessão de apresentação para passagem de conhecimento acerca da geração do *Template 2*.	NEXOND	**16 de maio**
3	**Satélites Corporativos**	Continuação da documentação *word* e do paralelo com o exercício tático de dezembro 2024 no processo de geração do satélite 79.	NEXOND	**23 de maio[1]**
4		Finalização das alterações dos códigos existentes de forma a incorporar as bases estruturais no processo de geração do satélite 80.	NEXOND	**16 de maio**
5	**Templates Locais & Satélites Corporativos**	Conclusão dos testes por parte da equipa do projeto à informação disponibilizada relativa a Emissões Financiadas.	NEXOND	**22 de maio**
6		Início dos testes à informação disponibilizada relativa a Imóveis Adjudicados (Totta Urbe + Stock adjudicados + próprios + dações + arrematações).	NEXOND	**29 de maio**

[1]O término desta atividade é posterior à próxima reunião de *PdS*.

NEYOND

NEW WAYS TO GO BEYOND

WWW.NEYOND.PT
