NEXOND

NEW WAYS TO GO BEYOND

Implementação Templates Locais & Satélites Corporativos

Ponto de Situação #7

Santander

29 de maio de 2025

Agenda

Objetivos

Realização da 7ª reunião de acompanhamento de projeto, de acordo com a seguinte ordem de atividades:

Sumário Executivo	Visão global sobre evolução da execução do projeto, riscos e dependências principais
Planeamento	Resumo do *status* das atividades a realizar ao longo do projeto
Esclarecimentos	Definição / discussão de temas identificados
Próximos Passos	Identificação das próximas atividades a desenvolver

Participantes

Santander

Susana Bernardo

NEXOND
NEW WAYS TO GO BEYOND

Diogo Escaleira

Ana Rita Caguerelho

Hélder Fernandes

Pedro Natário

João Galhardo

Data	Hora Início - Fim	Local
29 de maio de 2025	12:00 – 13:00	*Microsoft Teams Call*

Sumário Executivo

Progresso

- Conclusão dos testes à tabela de cálculo de emissões financiadas. As incidências foram identificadas e partilhadas com a equipa de tecnologia;
- Conclusão dos testes referentes à informação disponibilizada relativa a Imóveis Adjudicados;
- Finalização dos entregáveis relativos ao *Template 5*;
- Início das alterações de *script* do *Template 1*, ajustes da documentação *word e* início do paralelo com o exercício tático de dezembro 2024;
- Início das alterações de *script* do Satélite 84;
- Início da inclusão dos Imóveis Adjudicados nos Satélites 79&80.

Riscos e desafios

- Disponibilização da tabela corrigida das emissões financiadas (30/05);
- Disponibilização da NFIN, após alteração do universo (05/06);
- Disponibilização da tabela de certificados após a inclusão dos dados de consumos emissões provenientes do fornecedor externo para certificados reais (03/06);
- Associação entre a informação de adjudicados e a informação dos certificados energéticos;
- Disponibilização da tabela de universo.

Dependências

- Tecnologia.

Legenda

Sem impactos *Risco de impacto* *Impactos verificados*

Planeamento (1|3)

Plano de projeto – Implementação *Templates* Locais

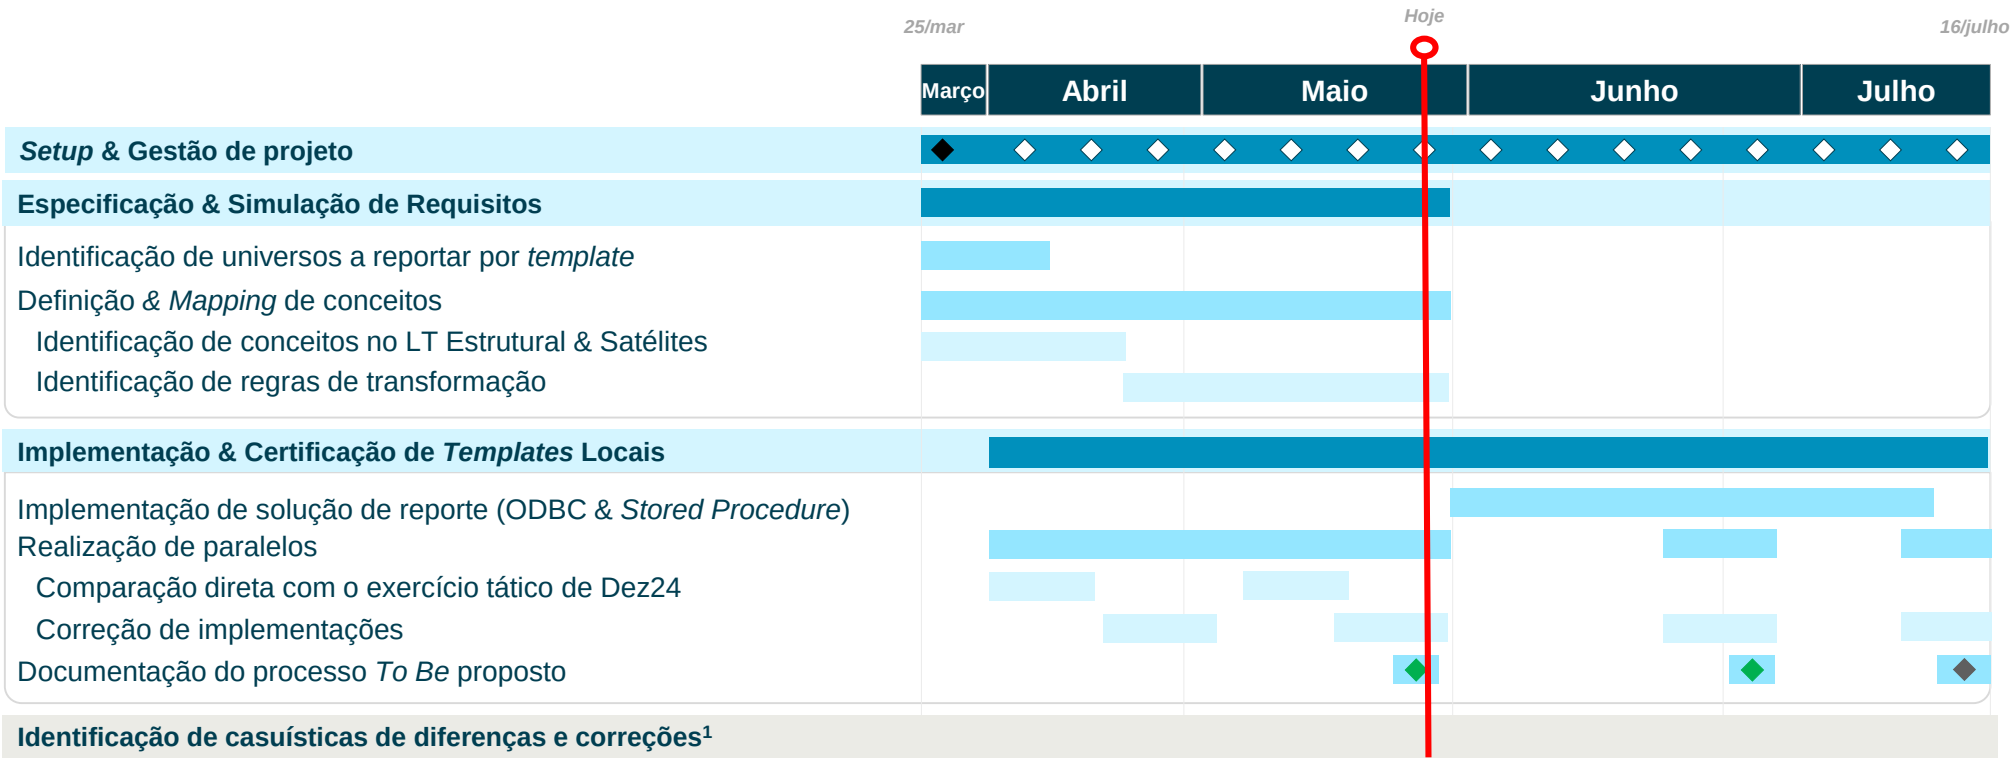

[1]A padronização de diferenças por casuísticas deverá ser avaliada no final deste projeto numa lógica de ***Time and Materials*** dada a imprevisibilidade de estimação da mesma

Legenda: ◆ Reunião de *Kickoff* ◇ Reunião de PDS ◆ Documentação preliminar ◆ Documentação final

Planeamento (2|3)

Plano de projeto – Implementação Satélites Corporativos

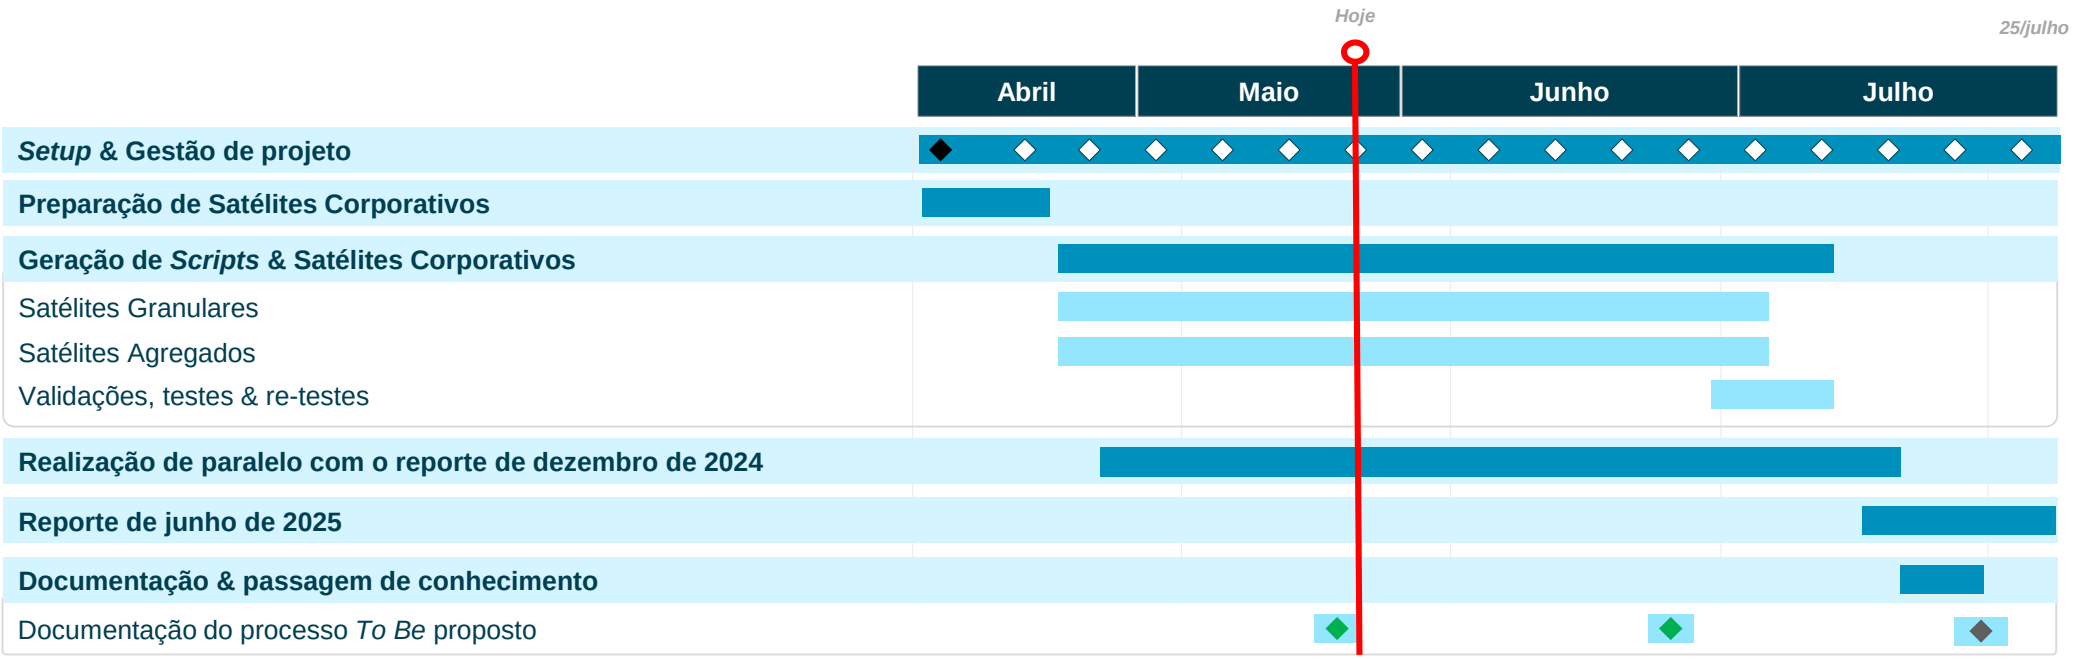

Identificação de casuísticas de diferenças e correções[1]

[1]A padronização de diferenças por casuísticas deverá ser avaliada no final deste projeto numa lógica de ***Time and Materials*** dada a imprevisibilidade de estimação da mesma

Legenda: ◆ Reunião de *Kickoff* ◇ Reunião de PDS ◆ Documentação preliminar ◆ Documentação final

Planeamento (3|3)

Plano de entregas – *Templates* Locais & Satélites Corporativos

Templates	Data de entrega[1]
Templates 1 (STE)	4 de julho
Templates 2 (STE)	22 de maio
Template 1	16 de junho
Templates 2	16 de maio
Template 4	27 de junho
Template 5	27 de maio
Templates 6,7,8,9	27 de junho
Template 10	30 de junho

Satélites	Data de entrega[1]
Satélite 79	23 de maio
Satélite 80	16 de maio
Satélite 83	27 de junho
Satélite 84	27 de junho
Satélite 93	16 de junho
Satélite 109	23 de junho

[1]O plano apresentado não inclui a inclusão do universo de adjudicados.

Próximos Passos

Listagem de próximos passos

Apresentamos em seguida as próximas atividades a desenvolver até 5 de junho e respetivos responsáveis:

ID	Âmbito	Atividades – 29 de maio a 5 de junho	Responsável	Data Fecho
1	**Templates Locais**	Finalização do *mapping* de conceitos e adaptação dos códigos existentes ao nível do *Template* 1 e realização dos paralelos com o reporte tático de dezembro 2024.	NEXOND	**16 de junho[1]**
2	**Satélites Corporativos**	Finalização da inclusão dos imóveis adjudicados nos Satélites 79&80.	NEXOND	**30 de maio**
3		Início do *mapping* de conceitos e adaptação dos códigos existentes dos Satélite 93.	NEXOND	**16 de junho[1]**
4	**Templates Locais & Satélites Corporativos**	Re-teste por parte da equipa do projeto à informação disponibilizada relativa a Emissões Financiadas.	NEXOND	**3 de junho**
5		Análise comparativa entre as Emissões Financiadas e a Calculadora de Emissões.	NEXOND	**6 de junho**

[1]O término desta atividade é posterior à próxima reunião de *PdS*.

NEYOND

NEW WAYS TO GO BEYOND

WWW.NEYOND.PT
