NEXOND

NEW WAYS TO GO BEYOND

Implementação Templates Locais & Satélites Corporativos

Ponto de Situação #4

Santander

08 de maio de 2025

Agenda

Objetivos

Realização da 3ª reunião de acompanhamento de projeto, de acordo com a seguinte ordem de atividades:

Sumário Executivo	Visão global sobre evolução da execução do projeto, riscos e dependências principais
Planeamento	Resumo do *status* das atividades a realizar ao longo do projeto
Esclarecimentos	Definição / discussão de temas identificados
Próximos Passos	Identificação das próximas atividades a desenvolver

Participantes

Santander

Susana Bernardo

NEXOND
NEW WAYS TO GO BEYOND

Diogo Escaleira

Hélder Fernandes

Henrique Correia

João Galhardo

Data	Hora Início - Fim	Local
08 de maio de 2025	14:30 – 15:30	*Microsoft Teams Call*

Sumário Executivo

Progresso

- Conclusão da especificação de requisitos para o cálculo de emissões financiadas;
- Reunião para alinhamento da parametrização do universo local na tabela AG801;
- Continuação do *mapping* de conceitos e início das alterações de *script* do *Template 2 STE*;
- Validações finais das alterações de *script* e documentação *word* relativo ao processo de geração do *Template* 2 *EBA*;
- Validações finais das alterações de *script* e documentação *word* relativo ao processo de geração dos satélite 79;
- Continuação do *mapping* de conceitos e início das alterações de *script* do satélite 80.

Riscos e desafios

- Disponibilização de adjudicados;
- Disponibilização da tabela de parametrização de Universo - *ag801_param_satel_univ*

Dependências

- Tecnologia.

Legenda

Sem impactos *Risco de impacto* *Impactos verificados*

Planeamento (1|3)

Plano de projeto – Implementação *Templates* Locais

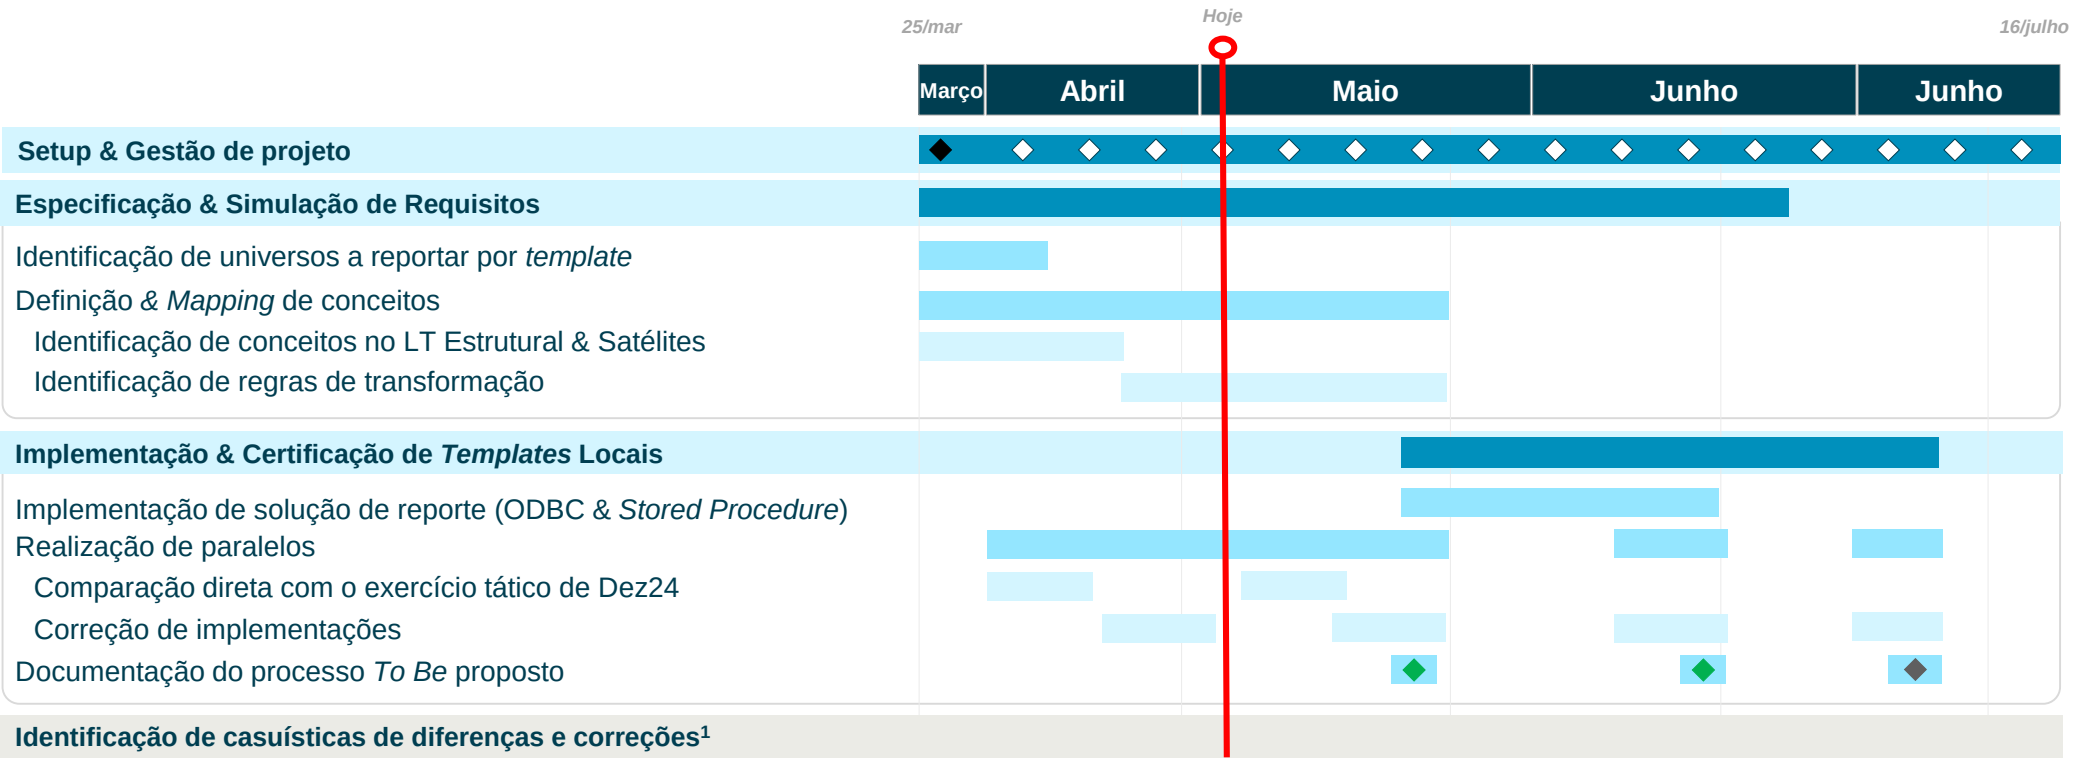

[1]A padronização de diferenças por casuísticas deverá ser avaliada no final deste projeto numa lógica de ***Time and Materials*** dada a imprevisibilidade de estimação da mesma

Legenda: ◆ Reunião de *Kickoff* ◇ Reunião de PDS ◆ Documentação preliminar ◆ Documentação final

Planeamento (2|3)

Plano de projeto – Implementação Satélites Corporativos

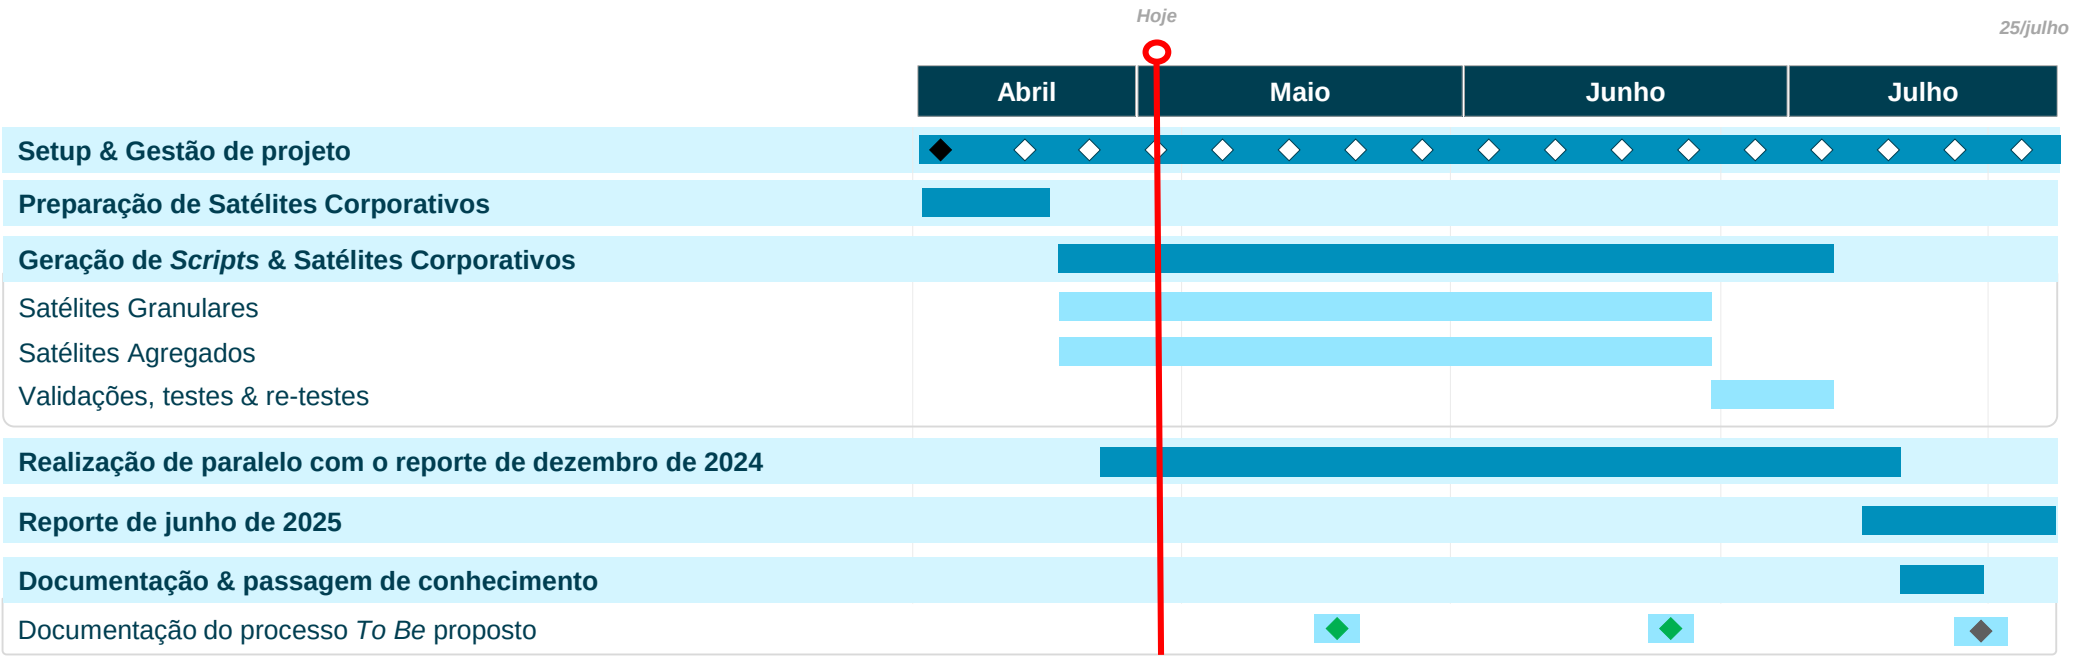

Identificação de casuísticas de diferenças e correções[1]

[1]A padronização de diferenças por casuísticas deverá ser avaliada no final deste projeto numa lógica de ***Time and Materials*** dada a imprevisibilidade de estimação da mesma

Legenda: ◆ Reunião de *Kickoff* ◇ Reunião de PDS ◆ Documentação preliminar ◆ Documentação final

Planeamento (3|3)

Plano de entregas – *Templates* Locais & Satélites Corporativos

Templates	Data de entrega[1]
Templates 1 (STE)	20 de junho
Templates 2 (STE)	16 de maio
Template 1	6 de junho
Templates 2	13 de maio
Template 4	29 de maio
Template 5	19 de maio
Templates 6,7,8,9	22 de maio
Template 10	27 de junho

Satélites	Data de entrega[1]
Satélite 79	13 de maio
Satélite 80	16 de maio
Satélite 83	29 de maio
Satélite 84	22 de maio
Satélite 93	6 de junho
Satélite 109	13 de junho

[1]O plano apresentado não inclui a inclusão do universo de adjudicados.

Próximos Passos

Listagem de próximos passos

Apresentamos em seguida as próximas atividades a desenvolver até 15 de maio e respetivos responsáveis:

ID	Âmbito	Atividades – 08 de maio a 15 de maio	Responsável	Data Fecho
1	**Templates Locais**	Continuação do *mapping* de conceitos e adaptação dos códigos existentes ao nível do STE2.	NEXOND	**16 de maio[1]**
2		Continuação do *mapping* de conceitos e adaptação dos códigos existentes ao nível do *Template* 2.	NEXOND	**13 de maio**
3	**Satélites Corporativos**	Continuação do *mapping* de conceitos e alterações dos códigos existentes de forma a incorporar as bases estruturais no processo de geração do satélite 79.	NEXOND	**13 de maio**
4		Continuação do *mapping* de conceitos e alterações dos códigos existentes de forma a incorporar as bases estruturais no processo de geração do satélite 80.	NEXOND	**16 de maio[1]**
5	**Templates Locais & Satélites Corporativos**	Testes à informação disponibilizada relativa a Emissões Financiadas.	NEXOND	**16 de maio[1]**
6		Testes à informação disponibilizada relativa a Imóveis Adjudicados (Totta Urbe + Stock adjudicados próprios.	NEXOND	**16 de maio[1]**

[1]O término desta atividade é posterior à próxima reunião de *PdS*.

NEYOND

NEW WAYS TO GO BEYOND

WWW.NEYOND.PT
